



A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Accoglimento proroga termini per ultimazione lavori ampliamento capannone - Presa atto stato finale lavori ampliamento capannone.

L'anno millenovecentottantotto il giorno 16 (sedici)
del mese di Giugno, alle ore 08.30 in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice
nelle persone dei Signori:

1. Luigi PIGNATELLI PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe MESTO	3. Alberto MESSINESE
4. Pietro LEONE	5. Emanuele VOZZA
6. Ezio VODOPIA (a.g.)	7. Edwige GRIFONI POLIDORI

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Giovanni SEMERARO (con diritto a voto)	9. Cosimo IRPINIA
--	-------------------

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Silvano CAVALIERE

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente riferisce:

Con il Contratto di appalto - Rep. n. 4259 - del 16/aprile/1987, regolarmente approvato dalla Sezione di Controllo della Regione Puglia di Taranto il 7/maggio/1987, con atto n. 11514 e registrato a Taranto il 28/maggio/1987, al n. 7072 - Mod. 71 M -, venivano affidati alla Ditta geom. Enrico RACCUJA di Taranto i lavori per la realizzazione dell'ampliamento del capannone annesso alla cabina di verniciatura, giusta de-

libera n. 366 del 21/ottobre/1986.

Con propria nota del 4/giugno/1988 il titolare della ditta omonima geom. Enrico RACCUJA ha chiesto la concessione di una proroga di n. 90 (novanta) giorni per la consegna dei lavori in quanto sono intervenute cause indipendenti dalla volontà dell'Impresa.

Appositamente interpellato, il Direttore dei Lavori - ing. Pietro RIZZO -, ha dato parere favorevole per l'accoglimento della richiesta di proroga in quanto diversi fattori sono intervenuti nella consegna di detti lavori per cause non imputabili alla volontà dell'Impresa medesima.

Sulla scorta di tale parere l'ing. RIZZO ha predisposto gli atti e la relazione sullo stato finale dei lavori in argomento.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- UDITA la relazione del Presidente;
- VISTA la lettera datata 4/giugno/1988 relativa alla richiesta di proroga consegna lavori inviata dalla ditta geom. Enrico RACCUJA;
- VISTA la nota del 15/giugno/1988 - prot. aziendale n. 5128 - inviata dall'ing. Pietro RIZZO - Direttore dei Lavori in argomento - con la quale il medesimo professionista si dichiara favorevole per l'accoglimento della richiesta;
- ESAMINATA la documentazione sullo stato finale dei lavori di ampliamento del capannone annesso alla cabina di verniciatura, che viene allegata al presente provvedimento come parte integrante;
- CON VOTI 6 (sei) favorevoli - su 7 (sette) votanti - ed il voto di astensione del consigliere Giuseppe MESTO

D E L I B E R A

- di accogliere, per i motivi in narrativa specificati, l'istanza relativa alla richiesta avanzata dalla Ditta geom. Enrico RACCUJA di Taranto relativa alla concessione della proroga di consegna lavori di n. 90 (novanta) giorni;
- di prendere atto dello stato finale dei lavori per la realizzazione dell'ampliamento del capannone annesso alla cabina di verniciatura, la cui documentazione prodotta dal Direttore dei Lavori - ing. Pietro RIZZO - viene allegata al presente provvedimento come parte integrante.

Il Segretario

Visto :

Il Presidente
R. Rulli

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 6/7/1988. -

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Resa esecutiva il 25/7/1988 dalla Sezione Prov. di Controllo della Regione
Puglia di Taranto che con prot.n.20164 non richiede atto. -

Il Funz. Dir. Superiore
(Francesco FERRANTE)

N



COMUNE DI TARANTO

SEGRETERIA GENERALE

AMAT-TARANTO

07738

21 IX 88

SEGRETERIA GENERALE

SERVIZI MUNICIPALIZZATI

A.M.A.T.

e p. c. ALL'UFFICIO

SEDI

DECISIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE RIUNITASI IL 12.9.1988

Oggetto: Presa atto deliberazioni A.M.A.T. sedute del 26.5.1988. - 9.6.1988 - 16.6.1988 -
18.6.1988 - 24.6.1988 - 6.7.1988 - 14.7.1988 - 22.7.1988 - 28.7.1988 - 29.7.199 - 1.8.988.-

(Relatore)

La Giunta Municipale nella seduta del 12.9.1988, Prende atto delle sottonotate
deliberazioni A.M.A.T.:

n.182 del 26.5.1988	✓	n.202 del 16.6.1988	✓
n.221 del 14.7.1988	✓	" 203 " " "	✓
n.222 " " " "	✓	" 204 " 18 " "	✓
n.183 " 9.6.1988	✓	" 205 " 24 " "	✓
n.186 " " " "	✓	" 206 " " " "	✓
" 187 " " " "	✓	" 207 " " " "	✓
" 188 " " " "	✓	" 208 " " " "	✓
" 189 " " " "	✓	" 209 " " " "	✓
" 191 " " " "	✓	" 210 " 6.7.1988	✓
" 193 " 16.6.1988	✓	" 192 " 9.6.1988	✓
" 194 " " " "	✓	" 211 " 14.7.1988	✓
" 195 " " " "	✓	" 212 " " " "	✓
" 197 " " " "	✓	" 213 " " " "	✓
" 198 " " " "	✓	" 214 " " " "	✓
" 199 " " " "	✓	" 215 " " " "	✓
" 200 " " " "	✓	" 216 " " " "	✓
" 201 " " " "	✓	" 217 " " " "	✓

Taranto, li 13 SET. 1988

./.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE DELLA G.M.

IL VICE SINDACO

COMUNE DI TARANTO

UFFICIO MUNICIPALIZZATE

N



COMUNE DI TARANTO

SEGRETERIA GENERALE

ALL'UFFICIO

e p. c. ALL'UFFICIO

SEDI

DECISIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE RIUNITASI IL

Oggetto:

(Relatore)

La Giunta Municipale nella seduta del

- 2 -

n.218 del 14.7.1988	✓	n.237 del 28.7.1988	✓
" 219 " " "	✓	" 238 " " "	✓
" 220 " " "	✓	" 239 " " "	✓
" 223 " " "	✓	" 240 " " "	✓
" 224 " " "	✓	" 241 " " "	✓
" 225 " " "	✓	" 242 " " "	✓
" 226 " " "	✓	" 243 " " "	✓
" 227 " 22.7.1988	✓	" 244 " " "	✓
" 228 " " "	✓	" 245 " " "	✓
" 229 " " "	✓	" 247 " " "	✓
" 230 " " "	✓	" 248 " " "	✓
" 231 " " "	✓	" 249 " " "	✓
" 232 " " "	✓	" 250 " " "	✓
" 233 " 28.7.1988	✓	" 251 " " "	✓
" 234 " " "	✓	" 252 " " "	✓
" 235 " " "	✓	" 253 " 29.7.1988	✓
" 236 " " "		" 257 " 1°.8.1988	✓

13 SET. 1988

Taranto, li

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE DELLA G. M.

IL VICE SINDACO

COMUNE DI TARANTO	
UFFICIO AMMINISTRATIVE	
Prot. n. 475	Data 19-9-88

REGIONE PUGLIA
SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI
TARANTO

74100 Taranto, li 25.7.1988

N. di prot. 20164

Risp. al N. del

Allegati N.

06436

29/7/88

SEGRETERIA GENERALE

Al l. g. Presidente

A.M.A.T.

Taranto

OGGETTO: Elenco deliberazioni non soggette a controllo:

N° 244 del 6.7.88 Comunicazioni.-

Si comunica ad ogni effetto che questo Comitato nella seduta del 22.7.1988 al N° 244 dell'o.d.g. ha esaminato l'elenco indicato in oggetto ed ha deliberato ai sensi dell'art. 23 della Legge Regionale n° 25 del 4.5.1985 il seguente provvedimento:

188

189

193

194

195

197

198

203

205

206

207

208

NON RICHIEDE ATTO





**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 6 LUG. 1988

SPETT/LE

ASSESSORATO ALLE MUNICIPALIZZATE

DEL COMUNE DI TARANTO

N. di protocollo 1409/88 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

OGGETTO : trasmissione deliberazioni.-

Trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n.3 (tre) copie dei sottoelencati provvedimenti adottati dalla Commissione Amministrativa di questa Azienda:

- Del.n.188- 09/6/88- Acquisto n.63 berretti estivi mediante licitazione ufficiosa.-
- Del.n.189- " " - Trasformazione nulla-osta provvisorio in certificato prevenzione incendi.- Affidamento incarico tecnico.-
- Del.n.193- 16/6/88- Accoglimento proroga termini per ultimazione lavori ampliamento capannone.- Presa atto stato finale lavori ampliamento capannone.-
- Del.n.194- " " - Approvazione verbale di aggiudicazione licitazioni private per fornitura di parti di ricambio meccanici e di carrozzeria.-
- Del.n.195- " " - Indizione concorso per la copertura del posto di Funzionario Superiore al Movimento - livello IO.-
- Del.n.197- " " - Ricorso dipendente SCOGNAMIGLIO Vincenzo - Resistenza - Nomina difensore.-
- Del.n.198- " " - Approvazione fattura di L. 3.003.100.- emessa dalla Tipografia STAPA SUD.-
- Del.n.203- " " - Commissione indizionei - Sostituzione del Dirigente officina.-
- Del.n.205- 24/6/88- Riconoscimento congedo straordinario per motivi elettorali in favore del dipendente BERDICCHIA Giuseppe.-
- Del.n.206- " " - Ricorso TAR PUGLIA Cooperativa LA RAFFAELLO c/AMAT.- Ordinanza TAR n.201/88.- Proposizione appello.-
- Del.n.207- " " - Ratifica delibera presidenziale n.204 del 18/6/88 relativa alla sostituzione del Segretario Commissione concorso interno Capi Operai.-
- Del.n.208- " " - Indizione licitazione privata per affidamento servizio di vigilanza.-

Distinti saluti.



ffp

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)

882002
6-7-88



A.M.A.T.- Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto

OGGETTO : Lavori di costruzione di un capannone metallico prefabbricato per cabina di verniciatura e lavorazioni di carrozzeria.- Relativo ampliamento in corso d'opera.

IMPRESA : Ditta RACCUJA del Geom. Enrico RACCUJA, ;con sede in Taranto alla via Sorcinelli n° 23.

CONTRATTO : n° 13867 (rep. 3597) in data 21.11.1985.

n° 7072 (rep. 4259) in data 16.04.1987.

ELENCO DEGLI ATTI RIGUARDANTI I LAVORI IN OGGETTO

- 1)- Deliberazione n° 144 del 23.04.1985, di affidamento dei lavori di costruzione del capannone (agli atti dell'azienda).
- 2)- Deliberazione n° 366 del 21.10.1986, di affidamento dei lavori di ampliamento del capannone (agli atti dell'azienda).
- 3)- Contratto n° 13867 (rep. 3597) in data 21.11.1985 relativo alla fornitura di cui al punto 1)- (agli atti dell'azienda).
- 4)- Contratto n° 7072 (rep. 4259) in data 16.04.1987 relativo alla fornitura di cui al punto 2)- (agli atti dell'azienda).
- 5)- Verbale di consegna lavori per le forniture di cui al punto 1)- (Allegato n° 1).
- 6)- Verbale di sospensione lavori n° 1 per la fornitura di cui al punto 1)- (Allegato n° 2).
- 7)- Verbale di ripresa lavori n° 1 per la fornitura di cui al punto 1)- (Allegato n° 3).
- 8)- Verbale di sospensione dei lavori n° 2 per la fornitura di cui al punto 1)- (Allegato n° 4).
- 9)- Verbale di ripresa dei lavori n° 2 per la fornitura di cui al punto 1)- (Allegato n° 5).
- 10)- Certificato di ultimazione lavori per la fornitura di cui al punto 1)- (Allegato n° 6).
- 11)- Verbale di consegna lavori per la fornitura di cui al punto 2)- (Allegato n° 7).



- 12)- Verbale di sospensione lavori n° 1 per la fornitura di cui al punto 2)- (Allegato n° 8).
- 13)- Verbale di ripresa lavori n° 1 per la fornitura di cui al punto 2)- (Allegato n° 9).
- 14)- Certificato di ultimazione lavori per la fornitura di cui al punto 2)- (Allegato n° 10).
- 15)- Registro di contabilità per i lavori di cui al punto 1)- (Allegato n° 11).
- 16)- Registro di contabilità per i lavori di cui al punto 2)- (Allegato n° 12).
- 17)- Stato finale dei lavori di cui ai punti 1)- e 2)- (Allegato n° 13).
- 18)- Certificati di pagamento per i lavori di cui al punto 1)-, N° 4 (Allegati 14 a-b-c-d-).
- 19)- Certificati di pagamento per i lavori di cui al punto 2)-, N° 3 (Allegati 15 a-b-c-).
- 20)- Relazione del Direttore dei Lavori sul Conto Finale. (Allegato 16)





AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI - TARANTO -

OGGETTO: Lavori di costruzione di un capannone
metallico prefabbricato per cabina di verniciatura;

IMPRESA : Ditta RACCUJA, del geom. Enrico RACCUJA,
con sede alla Via Sorcinelli, 23 - TARANTO -



Codice Fiscale: RCCNRC 47M21L049H

Partita I.V.A. : 00353660731

Delibera della Commissione Amministratrice n. 144
del 23 aprile 1985

Contratto : n. 13867 del 25/11/1985

Importo a base di contratto f. 71.000.000.=

PROCESSO VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.1
(art. 16 del Regolamento 25/5/1985, n. 350 e art. 30
del Capitolato Generale 16/7/1962, n. 1063)

L'anno 1986, il giorno 1 del mese di febbraio, in
Taranto :

- PREMESSO che con verbale in data 15 del mese di
ottobre 1985 vennero consegnati i lavori sopra
indicati;
- CONSIDERATO che in corso d'opera è stata prospet-
tata la possibilità di un ampliamento delle dimen-
sioni del capannone, per realizzare una migliore
organizzazione delle lavorazioni di officina;
- TENUTO presente che il relativo progetto di varian-
te è stato presentato al Comune per le necessarie

ALLEGATO 4.2

approvazioni, che richiederanno i relativi tempi tecnici presumibilmente non inferiori a mesi tre;

CHE nel frattempo non è possibile l'ulteriore prosieguo dei lavori, il sottoscritto ing. Pietro RIZZO, Direttore dei Lavori, alla presenza dell'imprenditore geom. Enrico RACCUJA, dispone di sospendere a decorrere da oggi, per le clausole suespresse, i lavori in epigrafe e di ciò redige il presente verbale.-

L'IMPRESA

[Signature]

IL DIRETTORE DEI LAVORI

[Signature]

Visto: IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

[Signature]

La presente copia, composta di 2 (due) fasciate, è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio.

Taranto, li - 5 LUG 1988

IL FUNZIONARIO SUPERIORE

(Franco FERRANTE)

[Signature]





A.M.A.T. - AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO



OGGETTO: Lavori di costruzione di un capannone metallico prefabbricato per cabina di verniciatura.

IMPRESA: Ditta RACCUJA del geom. Enrico RACCUJA, con sede alla via Sorcinelli, 23 - Taranto.

CODICE FISCALE: RCC NRC 47M21 L049H

PARTITA I.V.A.: 00353660731

CONTRATTO n. 13067 del 25/11/1985.-

Importo a base di contratto:.....f. 71.000.000.-



PROCESSO VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N.1

L'anno 1987 il giorno 22 del mese di giugno, in Taranto presso il deposito dell'A.M.A.T.:


- PREMESSO che con verbale in data 1/2/1986 i lavori di che trattasi vennero sospesi al fine di consentire l'espletamento della pratica edilizia di variante per l'ampliamento del costruendo capannone;
- CONSIDERATO che il relativo progetto è stato approvato ed il rilascio della concessione edilizia è in itinere;
- CHE l'esecuzione dei lavori di ampliamento venivano affidati alla stessa impresa RACCUJA con deliberazione n. 366 del 21/10/1986 e successivo contratto in data 16/4/1987, n. 4259;
- CONSTATATO, pertanto, essere cessate le cause che avevano motivato la sospensione dei lavori, il sottoscritto ing. Pietro RIZZO, Direttore dei Lavori, alla presenza dell'imprenditore geom. Enrico RACCUJA, dispone di riprendere, a decorrere

ALLEGATO 3

dalla data odierna, i lavori in epigrafe, e di ciò redige il
presente verbale.

L'IMPRESA

[Signature]



Visto: IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

[Signature]

La presente copia, composta di n. *2 (due)* racciate, e conforme
all'originale esistente presso questo Ufficio.

Taranto, il - 5 LUG. 1988



IL FUNZIONARIO SUPERIORE
[Signature] (FERRANTE)

ffp

A.M.A.T. - Azienda Municipalizzata Autotrasporti

T a r a n t o

v. C. Battisti n° 657 - Taranto .



OGGETTO : Lavori di costruzione di un capannone metallico prefabbricato per cabina di verniciatura.

IMPRESA : Ditta RACCUJA del Geom. Enrico RACCUJA con sede alla via Sorcinelli n° 23 - Taranto .

Codice Fiscale : RCC NRC 47 M 21 L 049 H

Partita I.V.A. : 0 0 3 5 3 6 6 0 7 3 1 .

CONTRATTO : n° 13867 (rep. 3597) in data 21.11.1985 .

Importo a base di contratto : £. 71.000.000=.

PROCESSO VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI N.2

(art. 16 del Regolamento 25.05.1985 N° 350 e art. 30 del Capitolato Generale 16.07.1962 n° 1063).

L'anno 1987, il giorno 30 del mese di giugno in Taranto :

- premesso che con verbale in data 22 del mese corrente, vennero ripresi i lavori di che trattasi dando luogo alla esecuzione delle opere che era possibile realizzare, non essendo vincolata alla adiacente struttura di ampliamento ;
- considerato che non era possibile l'ulteriore prosieguo dei lavori, in quanto le rimanenti opere erano correlate alla esecuzione della variante di ampliamento in corso d'opera, il sottoscritto Ing. Pietro RIZZO, Direttore dei Lavori, alla presenza dell'Imprenditore Enrico RACCUJA, dispone di sospendere, a decorrere da oggi per le clausole su espresse, i lavori

Allegato H

in epigrafe e di ciò redige il presente verbale.

L'IMPRESA

Forcucci & C.



Visto : IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

Carlini

La presente copia, composta di n. *2 (due)* racciate, e conforme all'originale esistente presso questo Ufficio.

Taranto, li *- 5 LUG. 1988*



IL FUNZIONARIO SUPERIORE
(Franco BERRANTE)

A.M.A.T. - Azienda Municipalizzata Autotrasporti

T a r a n t o

v. C. Battisti n° 657 - Taranto .

OGGETTO : Lavori di costruzione di un capannone metallico prefabbricato per cabina di verniciatura.

IMPRESA : Ditta RACCUJA del Geom. Enrico RACCUJA con sede alla via Sorcinelli n° 23 - Taranto .

Codice Fiscale : RCC NRC 47 M 21 L 049 H .

Partita I.V.A. : 0 0 3 5 3 6 6 0 7 3 1 .

CONTRATTO : n° 13867 (rep. 3597) in data 21.11.1985 .

Importo a base di contratto : £. 71.000.000=.

PROCESSO VERBALE DI RIPRESA LAVORI N. 2


L'anno 1988, il giorno 20 del mese di aprile, in Taranto presso il Deposito dell'A.M.A.T. :

- premesso che con verbale in data 30.06.1987 i lavori di che trattasi vennero sospesi al fine di consentire il prosieguo dei lavori di ampliamento, oggetto di variante in corso di opera ;

- considerato che i suddetti lavori erano stati realizzati in modo da poter consentire il completamento delle opere sospese il sottoscritto Ing. Pietro RIZZO , Direttore dei Lavori, alla presenza dell' Imprenditore Geom. Enrico RACCUJA, dispone di riprendere, a decorrere dalla data odierna i lavori in epigrafe e di ciò redige il presente verbale.

L' IMPRESA

Raccuja Enri



o / o
Allegato 5

Visto : IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

Luigi


La presente copia, composta di n. 2 (due) fasciate, e conforme
all'originale esistente presso questo Ufficio.

Taranto, li. - 5 LUG. 1988



IL FUNZIONARIO SUPERIORE

(Giorgio FERRANTE)



A.M.A.T. - Azienda Municipalizzata Autotrasporti

T a r a n t o

v. C. Battisti n° 657 - Taranto .

OGGETTO : Lavori di costruzione di un capannone metallico pre-fabbricato per cabina di verniciatura.

IMPRESA: Ditta RACCUJA del Geom. Enrico RACCUJA con sede alla
via Sorcinelli n° 23 - TARANTO.

Codice Fiscale : RCC NRC 47 M 21 L 049 H.

Partita I.V.A. : 0 0 3 5 3 6 6 0 7 3 1 .

CONTRATTO : n° 13867 (rep. 3597) in data 21.11.1985.

Importo a base di contratto : £. 71.000.000=.

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno 1988, nel mese di aprile, il giorno 30 il sottoscritto
Ing. Pietro RIZZO, Direttore dei Lavori, visto l'art. 62 del
Regolamento per la Direzione, Contabilità, Collaudazione dei
lavori dello Stato che sono nell'attribuzione del Ministero
dei Lavori Pubblici, approvato con R.D. 25.05.1895 n° 350 ;
- considerato che la consegna dei lavori sopra indicati ha avuto luogo il giorno 15.10.1985 per cui i lavori dovevano essere ultimati alla data del 14.12.1985 ;
- che per consentire l'espletamento della pratica e l'esecuzione delle opere inerenti la perizia di variante relativa ai lavori di che trattasi, gli stessi venivano sospesi dallo 01.02.1986 al 22.06.1987, e dal 30.06.1987 al 20.04.1988 ;
- che per le avverse condizioni atmosferiche non era possibile



Allegato 6

operare per giorni 35 nel corso del periodo invernale ;
- che cessate le cause della sospensione i lavori venivano ri-
presi regolarmente

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 30.04.88,
con 10 giorni di ritardo rispetto al termine utile contrattuale.

L'IMPRESA

Forcini Eina

Visto : IL DIRETTORE DI

Corle



La presente copia, composta di n. 2 (due) tacciate, e conforme
all'originale esistente presso questo Ufficio.

Taranto, li - 5 LUG. 1988



IL FUNZIONARIO SUPERIORE
(Franco FERRANTE)

A.M.A.T. - AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO

OGGETTO: Lavori di ampliamento in corso d'opera del capanno-
ne annesso alla cabina di verniciatura.

IMPRESA: Ditta RACCUJA, del geom. Enrico RACCUJA, con sede in
Taranto alla Via Sarcinelli, 23.

CODICE FISCALE: RCC NRC 47M21 LO49H.-

PARTITA I.V.A.: 00353660731.-

CONTRATTO: n.4259 in data 16/4/1987.-

IMPORTO A BASE DI CONTRATTO: £.69.446.000.-

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA

L'anno 1987, il giorno 22 del mese di giugno, in Taranto
presso i locali dell'A.M.A.T. in via C. Battisti, 657;

Il sottoscritto ing. Pietro RIZZO, Funzionario Superiore
dell'A.M.A.T., Direttore dei Lavori;

- VISTO il progetto presentato dall'impresa dell'importo suin-
dicato;

- VISTO il contratto citato in premessa;

- CONSIDERATO che la Commissione Edilizia ha espresso parere
favorevole alla esecuzione delle opere e che il rilascio
della relativa concessione è in itinere;

- VISTO l'art.337 della vigente legge sui lavori pubblici e
l'art.10 del Regolamento 25/5/1985 n.350 sulla direzione,
contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato;

Previo avviso dato dal sottoscritto, è convenuto sul luogo
il geom. Enrico RACCUJA;

Il presente verbale è stato redatto in tre esemplari



ALLEGATO 7



Alla presenza continua dell'intervenuto il sottoscritto ha proceduto alla consegna di che trattasi, attenendosi alle prescrizioni del citato art.10;

Ha, pertanto, verificato con la scorta del progetto suindicato la corrispondenza fra i dati del progetto stesso e le attuali condizioni e circostanza locali, eseguendo accertamenti di misure, tracciamenti e ricognizioni;

Ha indicato i siti di impianto e la ubicazione delle varie opere da eseguire, con riferimento alla prescrizioni del contratto reggente l'appalto, sulle quali ha fornito ampi chiarimenti in relazione specialmente alla materiale struttura delle opere ed alla qualità dei materiali da impiegare.

Il sig. Raccuja geom. Enrico nella qualità summenzionata dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti la esecuzione dei lavori e di tutti gli oneri accollati all'impresa dal contratto e di accettare la consegna dei lavori, come sopra effettuata senza sollevare riserva od eccezione alcuna, restando inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in giorni 90 (novanta naturali, successivi e continui del predetto contratto, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il 20 settembre p.v..-

Del che si è redatto il presente verbale che, presa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

PER LA DITTA

Perini & C.

ORDINE DEGLI ING.
UFF. DIRETTORE DEI LAVORI
Dott. Ing. <i>[Signature]</i>
RIZZO Pietro
N. 422

Visto: IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

[Signature]



ffp

La presente copia, composta di n. 3 (lu) fasciate, e conforme
all'originale esistente presso questo Ufficio.

Taranto, li - 5 LUG. 1988



IL FUNZIONARIO SUPERIORE
(*Ferrante* FERRANTE)

A.M.A.T. - Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto

Oggetto : Lavori di ampliamento in corso d'opera del Capannone
annesso alla cabina di verniciatura.

IMPRESA : Ditta RACCUJA del Geom. Enrico RACCUJA, con sede in
Taranto alla via Sorcinelli n° 23 .

Codice Fiscale : RCC NRC 47M21 L049H.

Partita I.V.A. : 00353660731.

Contratto : n° 4259 in data 16.04.1987.

Importo a base di contratto : £. 69.446.000=.

PROCESSO VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI

(Art. 16 del Regolamento 25/05/1985 n° 350 e Art. 30 del Capitolo Generale 16/07/1962 n° 1063).

L'anno 1987, il giorno 10 del mese di luglio, in Taranto :

- Premesso che con verbale in data 22 del mese di giugno 1987 vennero consegnati i lavori sopraindicati ;
- Considerato che in corso d'opera é intervenuta una vertenza giudiziaria tra l'Impresa Appaltatrice e la Ditta fornitrice delle strutture prefabbricate ;
- Che per le ragioni di cui sopra la medesima Ditta é impossibilitata al regolare prosieguo delle opere ;
- Tenendo presente che é interesse dell'A.M.A.T., Azienda Appaltante, che i lavori proseguano con la dovuta chiarezza e linearità ;
- Sentito in proposito anche il parere della Direzione d'Esercizio, il sottoscritto Ing. Pietro RIZZO, Direttore dei Lavori




ALLEGATO 8

ri, ritiene in via prudenziale di procedere alla Sospensione
dei lavori, pertanto alla presenza dell'imprenditore geom.
Enrico RACCUJA, procede per le ragioni suindicate alla reda-
zione del presente verbale.

L'IMPRESA

Raccuja E. & C.



Visto : IL DIRETTORE D'ESERCIZIO

[Signature]

La presente copia, composta di n. 2 (due) fasciate, e conforme
all'originale esistente presso questo Ufficio.
Taranto, li. - 5 LUG. 1988



IL FUNZIONARIO SUPERIORE

(Franco PERRANTE)

[Signature]

A.M.A.T. - Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto

Oggetto : Lavori di ampliamento in corso d'opera del Capannone
annesso alla cabina di verniciatura.

IMPRESA : Ditta RACCUJA del Geom. Enrico RACCUJA, con sede in
Taranto alla via Sorcinelli n° 23.

Codice Fiscale : RCC NRC 47M21 L049H.

Partita I.V.A. : 00353660731.

Contratto : n° 4259 in data 16.04.1987.

Importo a base di contratto : £. 69.446.000=.

PROCESSO VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno 1987, il giorno 1 del mese di ottobre, in Taranto presso
il Deposito A.M.A.T.

- Premesso che con verbale in data 10 luglio 1987 i lavori di
che trattasi vennero sospesi in via prudenziale in virtù del
procedimento giudiziario in corso fra l'Impresa appaltatrice
e la Ditta fornitrice delle strutture prefabbricate ;
- Considerato che l'Impresa suddetta ha chiarito la propria po-
sizione, reperendo altra Ditta idonea al proseguimento del
lavoro ;
- Constatato, pertanto, essere cessata le cause che avevano mo-
tivato la Sospensione dei lavori, il sottoscritto ing. Pietro
RIZZO, Direttore dei lavori, alla presenza dell'imprenditore
geom. Enrico RACCUJA, dispone di riprendere, a decorrere
dalla data odierna i lavori in epigrafe, e di ciò redige il
presente verbale.



ALLEGATO 9

L'IMPRESA

locuni & c.



Visto : IL DIRETTORE D'ESERCIZIO

Carli

La presente copia, composta di n. 2 (due) fasciate, e conforme
all'originale esistente presso questo Ufficio.

Taranto, li...

- 5 LUG. 1988



IL FUNZIONARIO SUPERIORE
(Franco FERRANTE)

A.M.A.T. - Azienda Municipalizzata Autotrasporti

T a r a n t o

v. C. Battisti n° 657 - Taranto .

OGGETTO : Lavori di ampliamento in corso d'opera del capannone
annesso alla cabina di verniciatura.

IMPRESA : Ditta RACCUJA del Geom. Enrico RACCUJA con sede alla
v. Sorcinelli n° 23 - Taranto .

Codice Fiscale : RCC NRC 47 M 21 L 049 H.

Partita I.V.A : 0 0 3 5 3 6 6 0 7 3 1 .

CONTRATTO : n° 7072 (rep. 4259) in data 16.04.1987 .

Importo a base di contratto : £. 69.446.000=.

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno 1988, nel mese di aprile, il giorno 30, il sottoscritto
Ing. Pietro RIZZO, Direttore dei Lavori, visto l'art. 62 del
Regolamento per la Direzione, Contabilità, Collaudazione dei
lavori dello Stato che sono nell'attribuzione del Ministero dei
Lavori Pubblici, approvato con R.D. 25.05.1895 n ° 350 ;
- considerato che la consegna dei lavori sopra indicati ha avuto
luogo il giorno 22.06.1987 per cui gli stessi dovevano
essere ultimati entro il 20.09.1987 ;
- che gli stessi rimasero sospesi dal 10.07.1987 allo 01.10.87
come risulta dal relativo verbale ;
- che per avverse condizioni atmosferiche non era possibile
operare per giorni 60 nel corso del periodo dallo 01.10.87
allo 30.04.1988 ;



Allegato 10

- che cessate le cause della sospensione i lavori venivano ri-
presi regolarmente

CERTIFICA


che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 30.04.88,
con 80 giorni di ritardo rispetto al termine utile contrattuale.

L'IMPRESA

Rizzi

Visto : IL DIRETTORE DI

Corbelli



La presente copia, composta di n. 2 (due) raddoppiate, e conforme
all'originale esistente presso questo Ufficio.
Taranto, li - 5 LUG. 1988



IL FUNZIONARIO SUPERIORE
Franco FERRANTE



REGISTRO DI CONTABILITÀ

A.M.A.T. - AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI TARANTO

LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CAPANNONE
METALLICO PREFABBRICATO PER CABINA DI
VERNICIATURA

IMPRESA: GEOM. ENRICO RACCUTA
CONTRATTO: N. 13864 IN DATA 21/11/85
REP. 3594

IL PRESENTE LIBRETTO CONSTA DI N° 5 (CINQUE)
FOGLI NUMERATI E FIRMATI IN BIANCO E
VIENE CONSEGUATO AL DIRETTORE DEI LAVORI
ING. PIETRO RIZZO —

IL DIRETTORE D'ESERCIZIO

Mod.
3135



Registri Buffelli

Allegato H



N. d' ord.	Riferimenti	Data		LAVORI O PROVVISTE
		19	85	
1	1A	9	H	Scavo a sezione virtuale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura compreso l'opera della discarica, per malinano in di fluiti e fondazioni in genere
2	2A	"	"	Scavo a sezione ampia eseguito con mezzi meccanici per spostamento area da falimentare
3	3A	"	"	Cb per sottofondazioni di classe R'bk 150 kg/cm ²
4	4A	"	"	Cb per fondazioni di classe R'bk 250 kg/cm ² compreso l'opera dei cerni ed escluso il ferro di orditura
5	5A	"	"	Formazione di ancoraggi per strutture in elevazione con traverse ENA 160÷180 e cerniere in lamierino
6	6A	"	"	Acciaio di orditura per strutture di fondazione
7	7A	"	"	Formazione di l'ospaio in pietra calcarea di media finitura e sovrastanti massi lutto ordito con reti elettrosaldate a maglia quadrata spessori 20 cm
8	1B	"	"	Struttura portante capannone inclinata con profili IPE/HES/CND ed L trafilati a caldo (materiale a f.e. d'opera)
9	2B	"	"	Copertura realizzata in lamiera grecata luvenciata spessori 8/10 del tipo Alusic
10	3B	"	"	Copertura inclinata in pannelli sandwich di lamiera grecata di spessori 6/10 con interferto strato di lana di vetro
11	4B	"	"	Tompagno inclinato come alla voce 2B
12	5B	"	"	Tompagno inclinato come alla voce 3B (Voci 8.9.10.11.12 materiale a f.e. d'opera.)
				IL DIRETTORE LAVORI



N. d' ord.	Riferimenti	Data 1986	LAVORI O PROVVISI	Libre Misu	
				n.	pa
			EMESSO CERTIFICATO DI PAGAMENTO IN DATA 13/4 IL DIRETTORE LAVORI <i>[Signature]</i>		
13	1B	20 1	Struttura forante esplanade realizzata con profili IPE / HED / CNP ed L treflati a caldo	1	2
14	2B	u u	Copertura realizzata in lamiera queste perveniente sp. 8/10 del tipo Shun'e	u	u
15	3B	u u	Copertura realizzata in pannelli sand- wich di lamiera queste sp. 6/10 con interporto strato di lana di vetro	u	u
16	4B	u u	Tompagno realizzato come alla voce 2B	u	u
17	5B	u u	Tompagno realizzato come alla voce 3B (Voci 13.14.15.16.17 Saldo materiale a fine d'opera)	u	u
18		u u	MONTAGGIO ESEGUITO IL DIRETTORE DEI LAVORI <i>[Signature]</i>	u	u
			EMESSO CERTIFICATO DI PAGAMENTO IN DATA 23/ IL DIRETTORE DEI LAVORI <i>[Signature]</i>		
19		6 3	ULTERIORE MONTAGGIO STRUTTURE	u	u
			IL DIRETTORE DEI LAVORI <i>[Signature]</i>		
			EMESSO CERTIFICATO DI PAGAMENTO IN DATA IL DIRETTORE DEI LAVORI <i>[Signature]</i>		
ANNO 1987					
20		02-7	Completamento residuo montaggio		
21	1D	u u	Fornitura e posa in opera di grandine, pluvia- li, elementi d'angolo ecc.	1	3
			IL DIRETTORE DEI LAVORI <i>[Signature]</i>		
			EMESSO CERTIFICATO DI PAGAMENTO IN DATA 2/7 IL DIRETTORE DEI LAVORI		




FATTORI					PRODOTTI		Prezzo unitario	IMPORTI	
N. parti simili	Lunghezza	Larghezza	Altezza o profondità	Unità mis.	NEGATIVI	POSITIVI		PARZIALI	TOTALI
								RIPORTO	23.555,150
1985 PER £ 23.137.375									
L'IMPRESA									
	0,4 x 0,5 x 8765			kg		1753,00	2700	4.733,100	
	0,4 x 0,5 x 135			mg		27,00	22.000	594,000	
	0,4 x 0,5 x 120			mg		24,00	45.000	1.080,000	
	0,4 x 0,5 x 185			mg		37,00	24.000	888,000	
	0,4 x 0,5 x 125			mg		25,00	55.000	1.375,000	
				%		53%	21.654,500	11.476.883	
L'IMPRESA forn. b.m.								TOTALE	20.146.000
1986 PER £ 19.900.000									
L'IMPRESA forn. b.m.									
				%		44%	21.675,500	9.537.220	
RIPORTO 2° SAL								146.000	
								TOTALE	9.683.000
L'IMPRESA forn. b.m.									
8/3/1986 per £ 9.198.850									
L'IMPRESA forn. b.m.									
								662.350	
				kg		600	3.200	1.920.000	
L'IMPRESA forn. b.m.								TOTALE	2.582.350
PER £ 2.563.450									
L'IMPRESA forn. b.m.									
								TOTALE	55.820.720

per l'Amministrazione Appaltante

[Signature]

Appaltatore

[Signature]

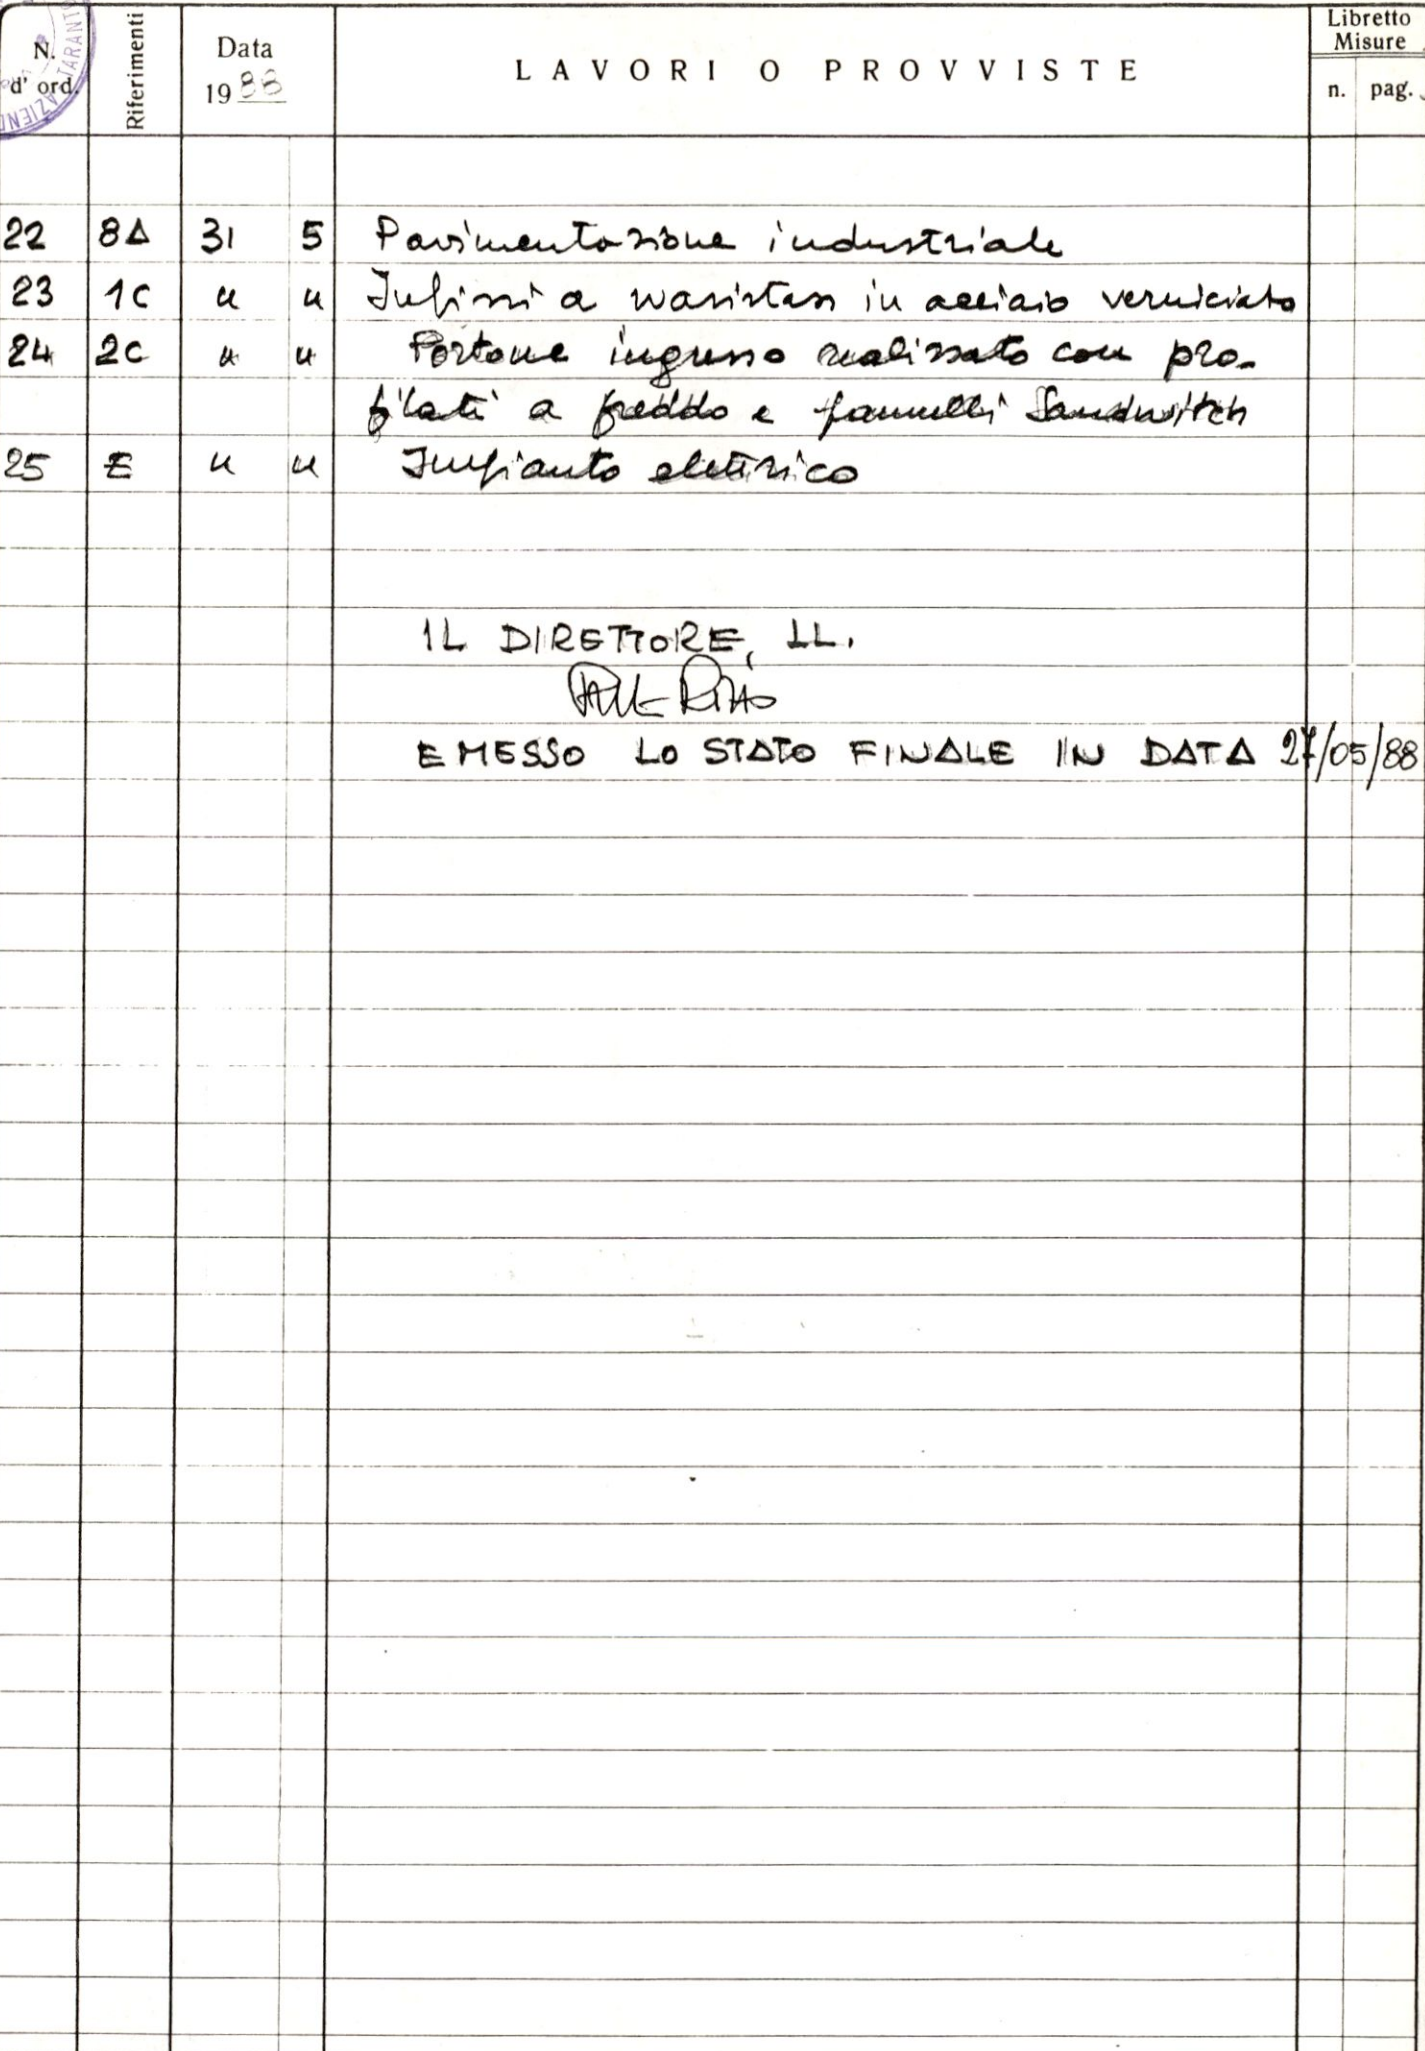



FATTORI				PRODOTTI		Prezzo unitario	IMPORTI		
N. parti simili	Lunghezza	Larghezza	Altezza o profondità	Unità mis.	NEGATIVI	POSITIVI	PARZIALI	TOTALI	
							RIPORTO	55820720	
				mq		230,00	12.000	2.760.000	
				u		50,00	95.000	4.750.000	
				q		23,00	160.000	3.680.000	
				Corpo		1,00	4.000.000	4.000.000	
								15.190.000	
							TOTALE	71.010.720	

L'IMPRESA

per l'Amministrazione Appaltante

IL DIRETTORE

[Signature]

L'IMPRESA

per l'Amministrazione Appaltante

[Signature]

[Signature]

per l'Amministrazione Appaltante

Amministrazione App
[Handwritten signature]

l'Appaltatore

for my brother



La presente copia, composta di n. 9 (nove) fasciate, è conforme
all'originale esistente presso questo Ufficio.

Taranto, li - 5 LUG 1988



IL FUNZIONARIO SUPERIORE

Franco FERRANTE



REGISTRO DI CONTABILITÀ

A.M.A.T. - AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI TARANTO

LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CAPAU
NE ANNESSO ALLA CABINA DI VERNI-
CIATURA

IMPRESA: GEOM. ENRICO RACCUJA
CONTRATTO: N. 4259 IN DATA 16/4/1987

DIRETTORE DEI LAVORI: ING. PIETRO RIZZO

IL PRESENTE LIBRETTO CONSTA DI 5 (CINQUE)
FOGLI NUMERATI E FIRMATI IN BIANCO

IL DIRETTORE D'ESERCIZIO

Mod.
3135



Registri Buffini

Allegato 12



N. d'ord.	Riferimenti	Data		LAVORI O PROVVISTE	Libretto Misura	
		19			n.	pa.
1	1a	02	04	Modifiche alla struttura esistente	1	1
2	1d			Smontaggio pannelli di recinzione e demolizione di parti del cordolo sottostante per la creazione di alcuni pilastri e demolizione della zoccolatura in c.a. già eseguita, con uso di martello		
3	2d			Scavo a sezione ampia eseguito con mezzi meccanici per splatamento area di pavimentazione		
4	3d			Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compreso l'onere del trasporto a discarica, per realizzazione plinti e muretto di coronamento h=50 e fondazione nuovo muro		
5	4d			ClS per sottofondazioni di classe R'bk 150 per opere di cui sopra		
6	5d			ClS per fondazioni e muri R'bk 250		
7	6d			Formazione di ancoraggi per strutture in elevazione con traverse in CNP e caselle in lamiera		
8	7d			Acciaio di orditura per strutture di fondazione ed elevazione		
9	8d			Formazione di vespaio in pietra calcarea di media pezzatura e sovrastante massetto di clS ordito con rete elettrosaldata a maglia quadrata, spessore 20 cm L'IMPRESA <i>forney bini</i> EMESSO CERTIFICATO DI PAGAMENTO IN DATA L'IMPRESA <i>forney bini</i>		
10	2a	27	10	Fornitura e posa in opera di nuova struttura metallica L'IMPRESA <i>forney bini</i>	1	2



FATTORI				PRODOTTI			Prezzo unitario	IMPORTI	
N. parti simili	Lunghezza	Larghezza	Altezza o profondità	Unità mis.	NEGATIVI	POSITIVI		PARZIALE	TOTALE
				carb		1,0	1.500.000	1.500.000	
				carb		1,0	1.600.000	1.600.000	
				mq		54,90	4000	219.600	
				me		14,40	22000	389.400	
				me		5,39	50.000	269.500	
				me		27,32	95.000	2.595.400	
				kg		200	1800	360.000	
				kg		1229	1200	1.474.800	
				mq		183	40.000	7.320.000	15.728.700
IL DIRETTORE LL. <i>[Signature]</i>									
02/07/87 PER £ 12.520.045#									
IL DIRETTORE LL. <i>[Signature]</i>									
				kg		11.020	2.700	29.754.000	29.754.000
IL DIRETTORE LL. <i>[Signature]</i>									
								TOTALE	45.482.700

per l'Amministrazione Appaltante

[Signature]

l'Appaltatore

[Signature]



N. d' ord.		Riferimenti	Data 1987		LAVORI O PROVVISTE
EMESSO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 2					
L'IMPRESA					
Pompi b.m.					
11	2b	22	12		Portoni d'ingresso scorrevoli realizzati con
12	3a	u	u		profili a freddo e pannelli sandwich
					Copertura realizzata in pannelli sandwich
					con interposto strato isolante
13	4a	u	u		Pareti di tamponamento come al punto 3a esclusi
					i portoni
14	4a	u	u		Pareti di tamponamento coperture base non
					realizzate
EMESSO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 3					
L'IMPRESA					
Pompi b.m.					
15	1b	30	4	1988	Infiltri a wassitan in acciaio verniciato
16	C	u	u		Grondaie, pluviali, colmi ed elementi
					d'angolo
17	9d	u	u		Pavimentazione industriale
18	E	u	u		Impianto elettrico di luce e forza
IL DIRETTORE LAVORI					
(M. M.)					
EMESSO STATO FINITO IN DATA 27/05/88					



FATTORI				PRODOTTI		Prezzo unitario	IMPORTI		
N. parti simili	Lunghezza	Larghezza	Altezza o profondità	Unità mis.	NEGATIVI	POSITIVI	PARZIALE	TOTALE	
							RIPORTO	45.482.700	
DATA 27/10/87 PER £ 23.654.430									
IL DIRETTORE LL. <i>[Signature]</i>									
				mq	48,00	160.000	7.680.000		
				mq	183,00	45.000	8.235.000		
				mq	116,47	55.000	6.405.850		
				cup 1200		55.000	6.600.000		
							TOTALE	15.720.850	
IN DATA 22/12/87 PER £ 12.498.000									
IL DIRETTORE LL. <i>[Signature]</i>									
				mq	25,37	95.000	2.457.650		
				kg	300	3200	960.000		
				mq	183	1200	2.196.000		
				corp	1,00	2900.000	2.900.000	8.513.650	
							totale	69.717.200	
							Rettifica in detrazione	-271.200	
							TOTALE	69.446.000	
L'IMPRESA <i>[Signature]</i>									

per l'Amministrazione Appaltante

[Signature]

l'Appaltatore

[Signature]

L'Appaltatore

early

locum tenens

per l'Amministrazione Appaltante

[Handwritten signature]

for my brother



La presente copia, composta di n. 8(040) tacciate, e conforme
all'originale esistente presso questo Ufficio.

Taranto, li. - 5 LUG. 1988



IL FUNZIONARIO SUPERIORE

(F. FERRANTE)



Ente appaltante : Azienda Municipalizzata Autotrasporti

T a r a n t o

LAVORI : di costruzione di un capannone metallico prefabbricato
per cabina di verniciatura e relativa variante in cor-
so d'opera.

IMPRESA : Ditta RACCUJA del Geom. Enrico RACCUJA, con sede in
via Sorcinelli n° 23 - Taranto.

Codice Fiscale : RCC NRC 47M21 L049H

Partita I.V.A. : 00353660731

Contratto : n° 13867 (Rep. n° 3597) in data 21.11.1985
n° 7072 (Rep. n° 4259) in data 16.04.1987.

STATO FINALE DEI LAVORI a tutto il 30.04.88

IMPORTO DELL'APPALTO :

Contratto n° 13867.....£. 71.000.000=.
Contratto n° 7072.....£. 69.446.000=.
TOTALE.....£. 140.446.000=.

TERMINI CONTRATTUALI :

Contratto n° 13867 .

data della consegna..... 15.10.1985.

data inizio lavori..... 15.10.1985.

scadenza del tempo utile per la ultimazione dei lavori.....

..... 14.12.1985.

i lavori rimasero sospesi dal.....01.02.1986 al 22.06.1987.

dal.....30.06.1987 al 20.04.1988.

per avverse condizioni atmosferiche non era possibile operare

Allegato 13



per complessivi giorni 35.

per cui la nuova scadenza del tempo utile é 20.04.1988.

giorni impiegati in più..... 10.

Contratto n° 7072.

data della consegna..... 22.06.1987.

data dell'inizio lavori..... 22.06.1987.

scadenza del tempo utile per la ultimazione dei lavori.....

..... 20.09.1987.

i lavori rimasero sospesi dal.....10.07.1987 al 01.10.1987.

per avverse condizioni atmosferiche non era possibile operare

per complessivi giorni 60.

per cui la nuova scadenza del tempo utile é 03.02.1988.

giorni impiegati in più..... 80.

AMMONTARE DEI LAVORI :

Contratto n° 13867.....£. 71.000.000=.

Contratto n° 7072.....£. 69.446.000=.

TOTALE.....£. 140.446.000=.

RITENUTE CONTRATTUALI EFFETTUATE :

Infortunati.....£. 1.005.114=.

Garanzia : la Ditta ha presentato polizza fidejussoria

Recupero anticipazione.....£. 12.240.710=.

TOTALE.....£. 13.245.824=.

ACCONTI CORRISPOSTI :

Contratto n° 13867.....£. 55.105.675=.

Contratto n° 7072.....£. 62.561.675=.

TOTALE.....£. 117.667.350=.



Rimane il residuo credito dell'Impresa di.....£. 22.778.650=.

Da cui vanno detratte a discrezione dell'Amministrazione Appal-

tante Penale sul contratto n° 13867 n° 10 giorni a £. 100.000

.....£. 1.000.000=.

Penale sul contratto n° 7072 n° 80 giorni a £. 50.000.....

.....£. 4.000.000=.

TOTALE.....£. 5.000.000=.

RESTANO.....£. 17.778.650=.

L'IMPRESA

[Handwritten signature]



Visto : IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

[Handwritten signature]

La presente copia, composta di n. 3 (tre) fasciate, e conforme
all'originale esistente presso questo Ufficio.

Taranto, li - 5 LUG 1988



IL FUNZIONARIO SUPERIORE

(F. FERRANTE)

Allegato 14 a



per copia conforme all'originale
SEGRETARIA GENERALE
Il Funzionario Superiore
(FERRANTE Francesco)

ENTE APPALTANTE

LAVORI

IMPRESA

CERTIFICATO N. _____

DUE

per il pagamento della **SECONDA** rata.

CERTIFICATI SPEDITI PRECEDENTEMENTE

Visto il contratto in data 21/11/1985 registrato a TARANTO
il 25/11/85 al n. 13867 col quale fu affidata alla predetta

Impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di

L. 71.000.000 (Settantuno milioni)

Risultando dalla contabilità fino ad oggi i seguenti conteggi:

AMMONTARE DEI LAVORI:

per lavori e somministrazioni	L	20000000
-------------------------------	---	----------

per materiali giacenti in cantiere

per

TOTAL	20000000
-------	----------

TOTALE L

ribasso
aumento

d'appalto _____ % _____ L

Risulta l'ammontare lordo dei lavori o delle somministrazioni

RITENUTE CONTRATTUALI:

del decimo sulle prime L. _____ L.

del ventesimo su L. _____ L.

del 0,5 % per infortuni

TOT.	1000000
------	---------

Dedotto il totale delle ritenute L.

Rimane l'ammontare netto di L.

Dedotti i precedenti acconti di complessive L.

Rimane il credito dell'Impresa di L.

ASSICURAZIONE INFORTUNI

Gli operai dell'Impresa sono assicurati

presso l'INAIL, Sede di TARANTO

con posizione assicurativa n. 35317/92

in data

scadente il

CERTIFICA

che a termini dell'art. **QUATTORDICI** del Capitolato speciale di appalto si può

pagare all'Impresa la somma di L. 19.900.000 (dieci milioni e 900.000)
in novecentomila)

Taranto

23/1/1986

IL DIRETTORE DEI LAVORI
REPARTO OFFICINA
IL FUNZIONARIO SUP.
ing. *PAZZO* *PAZZO*

Revised Budget 8505 (g)

Allegato 14 b



per copia conforme all'originale

SEGRETERIA GENERALE

Il Funzionario Superiore

(FERRANTE Francesco)

ENTE APPALTANTE A.M.A.T. Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto
LAVORI di costruzione di un capannone metallico prefabbricato
per cabina di verniciatura

IMPRESA GEOM. ENRICO RACCUJA, VIA SORCINELLI 23, TARANTO

CERTIFICATO N. TRE per il pagamento della TERZA rata.

CERTIFICATI SPEDITI PRECEDENTEMENTE					
n.	data	importo			
1	13.11.85	23437375			
2	23.1.1986	19900000			
			Visto il contratto in data <u>21/11/1985</u> registrato a <u>TARANTO</u>		
			il <u>25/11/85</u> al n. <u>13867</u> col quale fu affidata alla predetta		
			Impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di		
			<u>L. 71.000.000 (settautonomilioni)</u>		
			Risultando dalla contabilità fino ad oggi i seguenti conteggi:		
			AMMONTARE DEI LAVORI:		
			per lavori e somministrazioni L. <u>9683000</u>		
			per materiali giacenti in cantiere L. _____		
			per _____ L. _____		
TOTALE L. <u>9683000</u>					
ribasso d'appalto _____ % _____ L. _____					
aumento _____ % _____ L. _____					
Risulta l'ammontare lordo dei lavori o delle somministrazioni <u>9683000</u>					
RITENUTE CONTRATTUALI:					
del decimo sulle prime L. _____ L. _____					
del ventesimo su L. _____ L. _____					
del <u>0,5</u> % per infortuni L. <u>484150</u>					
_____ L. _____					
_____ L. _____					
Dedotto il totale delle ritenute L. <u>484150</u>					
Rimane l'ammontare netto di L. <u>9198850</u>					
Dedotti i precedenti acconti di complessive L. _____					
Rimane il credito dell'Impresa di L. <u>9198850</u>					
totale <u>43337375</u>					
ASSICURAZIONE INFORTUNI					
Gli operai dell'Impresa sono assicurati presso l'INAIL, Sede di <u>TARANTO</u> con posizione assicurativa n. <u>35317/92</u> in data _____ scadente il _____					
CERTIFICA					
che a termini dell'art. <u>QUATTORDICI</u> del Capitolato speciale di appalto si può pagare all'Impresa la somma di L. <u>9.198.850 (nove milioni e centonovantotto mila ottocentocinquanta)</u>					
<u>TARANTO</u> li <u>8/3/1986</u>					
IL DIRETTORE DEI LAVORI REPARTO OFFICINA IL FUNZIONARIO ing. <u>[Signature]</u>					



per copia conforme all'originale

SEGRETERIA GENERALE

Il Funzionario Superiore

(FERRANTE Francesco)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Ferrante", written over the printed name.

ENTE APPALTANTE AMAT - Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto
LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CAPANNONE METALLICO PREFABBRICATO
PER CABINA DI VERNICIATURA

IMPRESA GEOM. ENRICO RACCUJA, VIA SORCINELLI 23 - TARANTO

CERTIFICATO N. QUATTRO per il pagamento della QUARTA rata.

CERTIFICATI SPEDITI PRECEDENTEMENTE		
n.	data	importo
1	13.11.85	23437375
2	23.01.86	19900000
3	08.03.86	9198850
Visto il contratto in data <u>21/11/1985</u> registrato a <u>TARANTO</u> il <u>25/11/85</u> al n. <u>13867</u> col quale fu affidata alla predetta Impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di L. <u>71.000.000 (settantuno milioni)</u> Risultando dalla contabilità fino ad oggi i seguenti conteggi: AMMONTARE DEI LAVORI: per lavori e somministrazioni L. <u>2582350</u> per materiali giacenti in cantiere L. _____ per _____ L. _____ _____ L. _____ - TOTALE L. <u>2582350</u> ribasso d'appalto _____ % L. _____ aumento _____ Risulta l'ammontare lordo dei lavori o delle somministrazioni <u>2582350</u> RITENUTE CONTRATTUALI: del decimo sulle prime L. _____ del ventesimo su L. _____ del <u>0,5</u> % per infortuni L. <u>12900</u> _____ L. _____ _____ L. _____ Dedotto il totale delle ritenute L. <u>12900</u> Rimane l'ammontare netto di L. <u>2569450</u> Dedotti i precedenti acconti di complessive L. _____ Rimane il credito dell'Impresa di L. <u>2569450</u> ASSICURAZIONE INFORTUNI Gli operai dell'Impresa sono assicurati presso l'INAIL, Sede di <u>TARANTO</u> con posizione assicurativa n. <u>35317/92</u> in data _____ scadente il _____		
CERTIFICA che a termini dell'art. <u>QUATTORDICI</u> del Capitolato speciale di appalto si può pagare all'Impresa la somma di L. <u>2.569.450 (DUE MILIONI CINQUECENTO</u> <u>SESSANTANOVEMILA 450)</u> IL DIRETTORE DEI LAVORI <u>TARANTO</u> li <u>02/07/87</u> ORDINE D. G. ING. NERI della Provincia di <u>TARANTO</u> Dott. Ing. <u>ALBERTO</u> RIZZO Pietro N. <u>422</u>		



per copia conforme all'originale

SEGRETERIA GENERALE

Il Funzionario Superiore

Ferrante (FERRANTE Francesco)

IMPRESA: GEOM. ERICO RACCUJA, VIA SORCINELLI 23 - TARANTO

CERTIFICATI SPEDITI PRECEDENTEMENTE

Risultando dalla contabilità fino ad oggi i seguenti conteggi:

N. 422

Allegato 15a



per copia conforme all'originale
SEGRETERIA GENERALE
Il Funzionario Superiore
(*FERRANTE Francesco*)

ENTE APPALTANTE AMAT - AZIENDA MUNICIPALE AUTOTRASPORTI - TA
LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL COPRANNOVE ANNESSO ALLA CABINA
DI VERNICIATURA
IMPRESA GEOM. ENRICO RACCUGIA, VIA SORCINERI 23 - TARANTO

CERTIFICATO N. DUE per il pagamento della SECONDA rata.

CERTIFICATI SPEDITI PRECEDENTEMENTE			
n.	data	importo	
1	02/07/87	12520045	
totale			12520045

Visto il contratto in data 16/04/1987 registrato a _____
il _____ al n. 4259 col quale fu affidata alla predetta
Impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di
L. 69.446.000 (SESSANTANOVE MILIONI QUAT-
TROCENTO QUARANTA SEI MILA)
Risultando dalla contabilità fino ad oggi i seguenti conteggi:

AMMONTARE DEI LAVORI:

per lavori e somministrazioni	L.	<u>29754000</u>
per materiali giacenti in cantiere	L.	
per _____	L.	
TOTALE	L.	<u>29754000</u>

ribasso _____ d'appalto _____ % _____
aumento _____

Risulta l'ammontare lordo dei lavori o delle somministrazioni 29754000

RITENUTE CONTRATTUALI:

del decimo sulle prime	L.	
del ventesimo su L.	L.	
del <u>0,5</u> % per infortuni	L.	<u>148770</u>
<u>20% RECUPERO ANTICIPAZ.</u>	L.	<u>5950800</u>

Dedotto il totale delle ritenute L. 6099570

Rimane l'ammontare netto di L. 23654430

Dedotti i precedenti acconti di complessive L. _____

Rimane il credito dell'Impresa di L. 23654430

ASSICURAZIONE INFORTUNI

Gli operai dell'Impresa sono assicurati presso l'INAIL, Sede di TARANTO con posizione assicurativa n. 35317/92 in data _____ scadente il _____

CERTIFICA

che a termini dell'art. QUATTORDICI del Capitolato speciale di appalto si può pagare all'Impresa la somma di L. 23.654.430 (Ventitré milioni Seicentocinquantaquattro mila 430) Taranto, li 27/10/87

IL DIRETTORE DEI LAVORI
REPARTO OFFICINA
FUNZIONARIO SUP.
ING. PIETRO MAZZO



per copia conforme all'originale

SEGRETERIA GENERALE

Il Funzionario Superiore

(FERRANTE Francesco)

ENTE APPALTANTE AMAT - AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI - TA
LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CAPANNONE ANNESSO ALLA CABINA
DI VERNICIATURA

IMPRESA GEOM. ENRICO RACEUTA, VIA JORCINELLI 23 - TARANTO

CERTIFICATO N. TRE per il pagamento della TERZA rata.

CERTIFICATI SPEDITI PRECEDENTEMENTE		
n.	data	importo
1	02/07/87	12520045
2	27/10/87	23654430
totale <u>36174475</u>		

Visto il contratto in data 16/04/1987 registrato a _____
il _____ al n. 4252 col quale fu affidata alla predetta
Impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di
L. 69.446.000 (seicentotrentamilaquattrocento
quarantaseimila)
Risultando dalla contabilità fino ad oggi i seguenti conteggi:

AMMONTARE DEI LAVORI:

per lavori e somministrazioni	L	<u>15720850</u>
per materiali giacenti in cantiere	L	
per _____	L	
TOTALE	L	<u>15720850</u>

ribasso d'appalto _____ %
aumento _____ %

Risulta l'ammontare lordo dei lavori o delle somministrazioni 15720850

RITENUTE CONTRATTUALI:

del decimo sulle prime	L	
del ventesimo su L.	L	
del <u>0,5</u> % per infortuni	L	<u>78604</u>
<u>20% Recupero aut. c.p. az. on. c.</u>	L	<u>3144170</u>

Dedotto il totale delle ritenute L 3222774

Rimane l'ammontare netto di L 12498076

Dedotti i precedenti acconti di complessive L _____

Rimane il credito dell'Impresa di L 12498076

CERTIFICA

che a termini dell'art. QUATTORDICI del Capitolato speciale di appalto si può
pagare all'Impresa la somma di L 12.498.000 (dodici milioni
quattrocento novantotto mila)
TARANTO, li 22/12/87

IL DIRETTORE DEI LAVORI
REPARTO OFFICINA
IL FUNZIONARIO SUP.
ing. PIETRO RIZZO

Assicurazione Infortuni
Gli operai dell'Impresa sono assicurati
presso l'INAIL, Sede di TARANTO
con posizione assicurativa n. 35317/92
in data _____
scadente il _____

Registri Conf. 8505 (g)



per copia conforme all'originale

SEGRETERIA GENERALE

Il Funzionario Superiore

Ferrante (FERRANTE Francesco)



OGGETTO : Lavori di installazione di un capannone metallico prefabbricato nell'ambito del Deposito A.M.A.T. di via C.Battisti n° 657 - Taranto, e relativo ampliamento in corso d'opera.

IMPRESA : Ditta RACCUJA del Geom. Enrico RACCUJA, via Sorcinelli n° 23 - Taranto. C.F. RCC NRC 47 M 21 L 049 H.

P.I.V.A. 0 0 3 5 3 6 6 0 7 3 1.

CONTRATTO : n° 13867 (Rep. N° 3597) in data 21.11.1985 e
n° 7072 (Rep. N° 4259) in data 16.04.1987.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

Progetto principale: il progetto principale é stato presentato a cura della Ditta RACCUJA ed approvato in sede di aggiudicazione di gara con deliberazione n° 144 del 23.04.1985 e successiva n° 366 del 21.10.1986 per la variante in corso d'opera.

Affidamento lavori: a seguito dei summenzionati provvedimenti i lavori furono affidati alla Impresa Raccuja del Geom. Enrico RACCUJA, con sede in Taranto alla via Sorcinelli n° 23.

Importo contrattuale: fu stabilito inizialmente in £.71.000.000=.

Atti suppletivi: in corso d'opera fu riscontrata la necessità di provvedere all'ampliamento della struttura al fine di consentire la esecuzione delle lavorazioni di carrozzeria. Fu quindi approvata una variante in corso d'opera per un importo aggiuntivo di £. 69.446.000=.

Somma autorizzata : in definitiva la somma complessivamente



autorizzata per i lavori di cui alla presente relazione risulta dal seguente prospetto :

a)- per il contratto principale.....£. 71.000.000=.

b)- per il contratto suppletivo.....£. 69.446.000=.

TOTALE.....£. 140.446.000=.

LAVORO BASE :

Consegna dei lavori : i lavori furono consegnati con verbale redatto in data 15.10.1985.

Tempo stabilito : per la esecuzione dei lavori erano stabiliti 60 (sessanta) giorni lavorativi a partire dalla data di consegna dei lavori; il termine doveva scadere quindi il giorno 14.12.1985 .

Sospensione dei lavori : a seguito della necessità di provvedere all'ottenimento delle autorizzazioni per la esecuzione dei lavori di ampliamento della struttura nonché alla effettuazione delle opere relative, i lavori vennero sospesi dal 01.02.1986 al 22.06.1987 e dal 31.06.1987 al 20.04.1988, come risulta dai relativi verbali di sospensione.

Avverse condizioni atmosferiche : per avverse condizioni atmosferiche non era possibile operare per complessivi giorni 35.

Ripresa dei lavori : cessate le cause che determinarono la sospensione dei lavori, gli stessi vennero regolarmente ripresi, come risulta dai relativi verbali.

Ultimazione dei lavori : i lavori venivano ultimati in data 30.04.1988 come risulta dal relativo certificato di ultimazione.

LAVORI DI AMPLIAMENTO :

Consegna dei lavori : i lavori furono consegnati con verbale redatto in data 22.06.1987.

Tempo stabilito : per la esecuzione dei lavori erano stabiliti 90 (novanta) giorni lavorativi a partire dalla data di consegna dei lavori. Il termine doveva scadere quindi il giorno 20.09.87.

Sospensione dei lavori : a seguito del cambio della Ditta fornitrice della struttura metallica prefabbricata, i lavori venivano sospesi dal 10.07.1987 al 01.10.1987 come risulta dal relativo verbale di sospensione.

Avverse condizioni atmosferiche : per avverse condizioni atmosferiche non era possibile operare per complessivi giorni 60.

Ripresa dei lavori : cessate le cause che determinarono la sospensione dei lavori, gli stessi vennero ripresi regolarmente come risulta dal relativo verbale.

Ultimazione dei lavori : i lavori vennero ultimati in data 30.04.1988 come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori.

Tempo occorso per la esecuzione dei lavori : complessivamente, tenuto conto dei periodi di sospensione furono impiegati n° 10 giorni di ritardo sul lavoro base e n° 80 giorni di ritardo sui lavori di variante.

Andamento dei lavori : i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori.

Pagamenti in acconto : durante il corso dei lavori furono effet-





tuati pagamenti in acconto per un importo complessivo di lire
117.667.350=.

Stato finale : lo stato finale é stato redatto in data 27.05.88
ed importa complessivamente nette £. 22.778.650=.,così descritte:

- a)- per lavori, nette.....£. 140.446.000=.
- b)- per pagamenti in acconto.....£. 117.667.350=.
- c)- per penale.....£. 5.000.000=.

Secondo il detto stato finale resta quindi il credito netto alla
la Impresa di £. 17.778.650=. qualora venga detratta la penale e
di £. 22.778.650=. qualora l'Amministrazione in base al proprio
potere discrezionale decida di accogliere le giustificazioni
prodotte dall'Impresa.

Riserve dell'Impresa : l'Impresa ha firmato il registro di con-
tabilità senza riserve.

Infortuni in corso d'opera : non risulta che durante il lavoro
sia avvenuto alcun infortunio.

Assicurazioni sociali : con note nn. 6557/8/9 del 2 giugno 1988
sono state richieste agli enti interessati (I.N.A.I.L., I.N.P.S.,
ISPETTORATO DEL LAVORO). le prescritte dichiarazioni liberatorie.

AVVISI AD OPPONENDUM : essendosi svolti i lavori esclusivamente
all'interno dell'ambito aziendale, sono stati omessi gli avvisi
ad opponendum. Non risulta che durante il corso dei lavori sia-
no stati provocati danni diretti o indiretti alle proprietà di
terzi.

Cessione di credito da parte dell'Impresa : per i lavori in que-

stione l'Impresa esecutrice non ha effettuato la cessione dei suoi crediti.



Direzione dei Lavori : i lavori sono stati diretti dal sottoscritto Ing. Pietro RIZZO, Funzionario Superiore dell'Azienda A.M.A.T.

Taranto 01.06.1988.



Visto : IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

La presente copia, composta di n. 5 (cinque) racciate, è conforme
all'originale esistente presso questo Ufficio.

Taranto, li. - 5 LUG. 1988



IL FUNZIONARIO SUPERIORE
(Franco FERRANTE)

IMPRESA

Geom. *Enrico Raccuja*

Costruzioni Edili - Civili ed Industriali

74100 TARANTO

Via Sorcinelli, 23 - Tel. (099) 311908

Codice Fiscale: RCC NRC 47M21 L049H
Partita IVA: 00353660731
C.C.I.A.A. di Taranto N. 24825

di 30 settembre 1987

Spett.le A.M.A.T. Azienda Municipalizzata

Autotrasporti Taranto

via C. Battisti n° 657

74100 TARANTO

Alla C.A. del Direttore dei Lavori

Ing. Pietro RIZZO

Oggetto : Lavori di costruzione di un capannone metallico per cabina di verniciatura nell'ambito del Deposito A.M.A.T.- variante in corso d'opera.

Facendo seguito alla precedente nota del 09.07.1987, la sottoscritta Impresa appaltatrice delle opere di cui in oggetto fa presente che in relazione agli sviluppi della vertenza giudiziaria in corso, ha potuto reperire altra Ditta specializzata ed idonea alla costruzione delle strutture prefabbricate relative al capannone in oggetto ed è pertanto in grado di riprendere immediatamente i lavori.

Distinti saluti.

(Geom. Enrico RACCUJA)

Raccuja Enrico

Rizzo Pietro



per copia conforme all'originale

SEGRETERIA GENERALE

Il Funzionario Superiore

FERRANTE Francesco

Geom. Enrico Raccuja

74100 TARANTO

Via Sorcinelli, 23 - Tel. (099) 311906

Codice Fiscale: RCC NRC 47M21 L049H
Partita IVA: 00353660731
C.C.I.A.A. di Taranto N. 24825

li. 09 luglio 1987

Spett.le A.M.A.T. Azienda Municipalizzata

Autotrasporti Taranto

via C.Battisti n° 657

74100 TARA?NTO

ALLA C.A. del Direttore dei Lavori

Ing. Pietro RIZZO



Oggetto : Lavori di costruzione di un capannone metallico per cabina di verniciatura nell'ambito del Deposito A.M.A.T.- variante in corso d'opera.

La sottoscritta Impresa Geom. Enrico RACCUJA, appaltatrice delle opere indicate in oggetto, avendo in corso un procedimento giudiziario con la Ditta BLITZ, fornitrice delle strutture metalliche prefabbricate dell'erigendo capannone, fa presente a codesta D.L. di essere impossibilitata suo malgrado nella prosecuzione dei lavori avendo la su menzionata Ditta sospeso la propria fornitura in attesa di una risoluzione della vertenza. Sarà cura dell'Impresa scrivente di provvedere al reperimento di altra Ditta qualificata per la fornitura delle carpenterie in questione, dando corso quanto prima alla ripresa dei lavori.

Distinti saluti.

(Geom. Enrico RACCUJA)

Joseph Brown

✓
costly



per copia conforme all'originale
SEGRETERIA GENERALE
Il Funzionario Superiore
(*... RR. I.T. Francesco*)



AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
DI COSTRUZIONE
OGGETTO: LAVORI DI UN CAPANNONE METALLICO PREFABBRICATO PER CABINA VERNICIATURA.-



IMPRESA: Ditta RACCUJA, del Geom. Enrico RACCUJA,
con sede alla Via Sorcinelli, 23 - Taranto.

Codice Fiscale: RCCNRC47M21L049H.-

Partita I.V.A.: 00353660731.-

Delibera della Commissione Amministratrice n. 144
del 23 Aprile 1985.-

CONTRATTO: in corso di stipula.

IMPORTO A BASE DI CONTRATTO.....£.71.000.000.-

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA

Con le riserve di cui all'art. 337 della Legge 20
Marzo 1865 n.2248 (art.10 del Regolamento 25 Maggio
1895 n.350);

L'anno 1985 il giorno 15 del mese di Ottobre, in
Taranto presso i locali dell'A.M.A.T. in via Cesare
Battisti, 657;

Il sottoscritto ing. Pietro RIZZO, Funzionario Su-
periore dell'A.M.A.T., Direttore dei Lavori;

VISTO il progetto di massima presentato dall'impresa
dell'importo di £. 71.000.000.-;

VISTA la delibera dell'A.M.A.T. n. 144 del 23/4/1985
con la quale venivano aggiudicati i lavori suindica-
ti alla impresa del Geom. Enrico Raccuja, domici-

ALLEGATO n. 1



liata in Taranto alla Via Sorcinelli n. 23;

VISTO l'art. 337 della vigente Legge sui Lavori Pubblici e l'art. 10 del Regolamento 25/5/1895 n. 350 sulla direzione, contabilità e collaudazione dei Lavori dello Stato;

Previo avviso dato dal sottoscritto, sono convenuti sul luogo: i Sigg. Geom. RACCUJA Enrico e ANCONA Giuseppe.

Alla presenza continua degli intervenuti il sottoscritto ha proceduto alla consegna di che trattasi, attenendosi alle prescrizioni del citato art.10:-

Ha, pertanto, verificato con la scorta del progetto suindicato, la corrispondenza fra i dati del progetto stesso e le attuali condizioni e circostanze locali, eseguendo accertamenti di misure, tracciamenti e ricognizioni; ha indicato i siti di impianto e la ubicazione delle varie opere da eseguire, con riferimento alle prescrizioni del Capitolato Speciale reggente l'Appalto, sulle quali ha fornito ampi chiarimenti in relazione specialmente alla materiale struttura delle opere ed alla qualità dei materiali da impiegare.

Ha, altresì, ribadito che prima dell'inizio dei lavori la Ditta Appaltatrice deve provvedere alla presentazione del progetto esecutivo, nonchè alla

denuncia delle opere dal Genio Civile.



Il Sig. RACCUJA geom. Enrico nella qualità summenzionata dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti alla esecuzione dei lavori e di tutti gli oneri accollati all'impresa dal Capitolato Speciale di Appalto e di accettare la consegna dei Lavori, come sopra effettuata, sotto le riserve di Legge, senza sollevare riserva od eccezione alcuna, restando inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in 60.- (sessanta) giorni, naturali, successivi e continui dell'art. 9 del detto Capitolato, cosicchè l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il 14 Dicembre.

Resta, altresì, stabilito che il pagamento della prima rata di acconto non potrà essere effettuato se non dopo la stipula ed approvazione del Contratto da parte degli Organi Competenti e gli atti contrattuali non siano stati registrati agli effetti fiscali ove del caso.-

Si stabilisce pure che la riserva di Legge deve intendersi sciolta dopo il perfezionamento degli atti di approvazione del contratto.

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-

via lettura e conferma viene sottoscritto come ap-
presso:

PER LA DITTA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IMPRESA
Geom. ENRICO RACCUJA
Via Sorcinelli, 23
74100 TARANTO

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto

REDAZIONE
IL FUNZIONARIO SUP.
Ing. P. R. 1988

VISTO: IL DIRETTORE DELL'ESERCIZIO

La presente copia, composta di n. 4 (quattro) fasciate, è conforme
all'originale esistente presso questo Ufficio.
- 5 LUG. 1988
Taranto, li



IL FUNZIONARIO SUPERIORE
(F. FERRANTE)
