



A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Presa atto fattura n. 27/80 - Impresa Angelo De Bartolomeo - Taranto -

L'anno millenovecentottanta il giorno 26 (ventisei)

del mese di Novembre, alle ore 17.30 in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. Luigi PIGNATELLI PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 2. <u>Fulvio MASTROBUONO</u> | 3. <u>Piero MONOPOLI</u> (a.g.) |
| 4. <u>Anselmo NEVOLI</u> (a.g.) | 5. <u>Giuseppe IMESTO</u> |
| 6. <u>Alberto GALLUZZO</u> | 7. _____ |

MEMBRI SUPPLENTI

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 8. <u>Vitantonio LEONE</u> (a.g.) | 9. <u>Francesco RUGGIERI</u> (con diritto di voto) |
|-----------------------------------|--|

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. sig. Francesco PUCCI

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

PREMESSO che i responsabili del Reparto Movimento più volte sollecitati dalle Organizzazioni Sindacali facevano presente che lo scarico del gabinetto sito nei locali di Via D'Aquino n. 40 presentava continui intasamenti con fuoriuscita di liquami che procurava cattivo odore negli stessi uffici;


- CHE a seguito di tanto la Direzione di Esercizio invitava l'Impresa Angelo De Bartolomeo - Via Margherita, 43 - Taranto - ad effettuare un sopralluogo per individuare le cause dell'inconveniente innanzi accennato;
- CHE la citata Impresa nel far presente che l'inconveniente era dovuto alla inesistenza di tubazione di collegamento all'impianto fognante per cui necessitava scavare e prevedere la tubazione sino allo scarico generale;
- CHE a seguito di quanto innanzi l'Impresa Angelo De Bartolomeo veniva dalla Direzione di Esercizio autorizzata ai lavori in argomento;
- CHE a lavori ultimati l'Impresa appaltatrice faceva pervenire la fattura n. 27/80 e la relazione relativa ai lavori eseguiti, che allegate al presente provvedimento fanno parte integrante dello stesso;
- CHE l'A.M.A.T. riferendosi ai lavori eseguiti con nota del 24/9/1980 chiedeva all'Ufficio Tecnico del Comune di Taranto un parere sulla congruità dei prezzi nella fattura innanzi indicata;
- CHE il citato Ufficio Tecnico del Comune di Taranto con sua nota del 4/11/80 dichiarava che i prezzi relativi ai materiali potevano ritenersi congrui mentre per quanto riguarda il tempo di esecuzione lavori esprimeva perplessità adducendo di non essere in grado di convalidare lo stesso tempo non avendo avuto la possibilità di seguire i lavori di riparazione ed infine per quanto riguarda gli onorari corrisposti dall'Impresa ai propri addetti invitava l'Azienda a sentire l'Associazione Industriali di Taranto;
- CHE a seguito di confronto con la citata Associazione Industriale si è stabilito che anche i prezzi riguardanti le prestazioni di mano d'opera sono da ritenersi corrispondenti alla richiesta;
- CONSIDERATO che l'Impresa appaltatrice, tenuto conto dei precedenti rapporti avuti con l'Azienda nella esecuzione di precedenti lavori non ha fatturato unitamente ai prezzi riguardanti i materiali e le prestazioni la prevista percentuale del 10% per spese generali e quella del 10% per utile dell'Impresa;
- RITENUTA conveniente la somma richiesta dall'Impresa per i lavori in argomento;
- VISTI gli atti;
- AVUTO il voto consultivo del ff. Direttore di Esercizio;
- A VOTI unanimi

DELIBERA

- 1) - di prendere atto della fattura n. 27/80 del 9/9/80 emessa dall'Impresa Angelo De Bartolomeo - Via Margherita, 43 - Taranto, relativa ai lavori di demolizione e rifacimento dei servizi igienici siti nei locali del Reparto Movimento di Via D'Aquino, 40;
- 2) - di imputare la spesa complessiva di £. 2.547.250.=(duemilioni cinquecentoquarantasettemiladuecentocinquanta) al Cap. 29 Art. 13 con ~~sub~~no di pari importo dal Cap. 20 del bilancio di previsione dell'anno 1980.-

Visto:

Il Presidente



Il Segretario

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Esercizio 1980 Titolo I Categ. IV

Cap. 29 Art. 13

MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI

Stanziamiento originario L. 8.000.000

Somme aggiunte L. 2.547.250

Totale L. 10.547.250

Somme detratte L. "

Stanziamiento aggiornato L. 10.547.250

Somme già impegnate L. 6.039.885

Amm. del presente impegno L. 2.547.250

Disponibilità di impegni L. 1.960.115

Il Direttore
(Francesco FERRANTE)



A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Presa atto fattura n. 27/80 - Impresa Angelo De Bartolomeo - Taranto.-

L'anno millenovecentottanta il giorno 26 (ventisei)
del mese di Novembre, alle ore 17.30 in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice
nelle persone dei Signori:

1. Luigi PIGNATELLI PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Fulvio MASTROBUONO 3. Piero MONOPOLI (a.g.)
4. Anselmo NEVOLI (a.g.) 5. Giuseppe MESTO
6. Alberto GALLUZZO 7. _____

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Vitantonio LEONE (a.g.) 9. Francesco RUGGIERI (con diritto a voto).-

Assiste ^{ff.} il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. sig. Francesco PUCCI

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- **PREMESSO** che i responsabili del Reparto Movimento più volte sollecitati dalle Organizzazioni Sindacali facevano presente che lo scarico del gabinetto sito nei locali di Via D'Aquino n.40 presentava continui intasamenti con fuoriuscita di liquami che procurava cattivo odore negli stessi uffici;

- CHE a seguito di tanto la Direzione di Esercizio invitava l'Impresa Angelo De Bartolomeo - Via Margherita, 43 - Taranto - ad effettuare un sopralluogo per individuare le cause dell'inconveniente innanzi accennato;
- CHE la citata Impresa nel far presente che l'inconveniente era dovuto alla inesistenza di tubazione di collegamento all'impianto fognante per cui necessitava scavare e prevedere la tubazione sino allo scarico generale;
- CHE a seguito di quanto innanzi l'Impresa Angelo De Bartolomeo veniva dalla Direzione di Esercizio autorizzata ai lavori in argomento;
- CHE a lavori ultimati l'Impresa appaltatrice faceva pervenire la fattura n. 27/80 e la relazione relativa ai lavori eseguiti, che allegate al presente provvedimento fanno parte integrante dello stesso;
- CHE l'A.M.A.T. riferendosi ai lavori eseguiti con nota del 24/9/1980 chiedeva all'Ufficio Tecnico del Comune di Taranto un parere sulla congruità dei prezzi nella fattura innanzi indicata;
- CHE il citato Ufficio Tecnico del Comune di Taranto con sua nota del 4/11/80 dichiarava che i prezzi relativi ai materiali potevano ritenersi congrui mentre per quanto riguarda il tempo di esecuzione lavori esprimeva perplessità adducendo di non essere in grado di convalidare lo stesso tempo non avendo avuto la possibilità di seguire i lavori di riparazione ed infine per quanto riguarda gli onorari corrisposti dall'Impresa ai propri addetti invitava l'Azienda a sentire l'Associazione Industriali di Taranto;
- CHE a seguito di confronto con la citata Associazione Industriale si è stabilito che anche i prezzi riguardanti le prestazioni di mano d'opera sono da ritenersi corrispondenti alla richiesta;
- CONSIDERATO che l'Impresa appaltatrice, tenuto conto dei precedenti rapporti avuti con l'Azienda nella esecuzione di precedenti lavori non ha fatturato unitamente ai prezzi riguardanti i materiali e le prestazioni la prevista percentuale del 10% per spese generali e quella del 10% per utile dell'Impresa;
- RITENUTA conveniente la somma richiesta dall'Impresa per i lavori in argomento;
- VISTI gli atti;
- AVUTO il voto consultivo del ff. Direttore di Esercizio;
- A VOTI unanimi

DELIBERA

- 1) - di prendere atto della fattura n. 27/80 del 19/9/80 emessa dall'Impresa Angelo De Bartolomeo - Via Margherita, 43 - Taranto, relativa ai lavori di demolizione e rifacimento dei servizi igienici siti nei locali del Reparto Movimento di Via D'Aquino, 40;
- 2) - di imputare la spesa complessiva di £. 2.547.250.- (duemilioni cinquecentoquarantasettemiladuecentocinquanta) al Cap. 29 Art. 13 con ~~sotno~~ di pari importo dal Cap. 20 del bilancio di previsione dell'anno 1980.-

IL SEGRETARIO
ft/. FERRANTE Francesco

Visto: IL PRESIDENTE
ft/.ing. Luigi PIGNATELLI

IL SEGRETARIO
p.c.c.: Della Commissione Amministrativa
Ferrante Francesco

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Esercizio 1980 Titolo I Categ. IV

Cap. 29 Art. 13

MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI

Stanziamento originario L. 8.000.000

Somme aggiunte L. 2.547.250

Totale L. 10.547.250


Somme detratte L. 2

Stanziamento aggiornato L. 10.547.250

Somme già impegnate L. 6.039.885

Amm. del presente impegno L. 2.547.250

Disponibilità di impegni L. 1.960.115

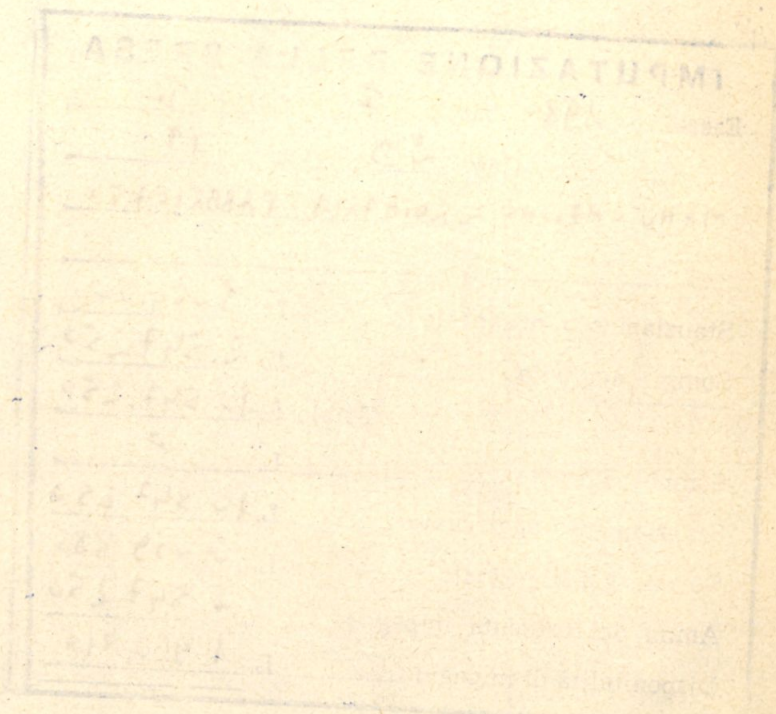

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Resa esecutiva il

Il Direttore



ALL'ASSESSORATO ALLE MUNICIPALIZZATE
~~AL DIRIGENTE~~

COMUNE DI TARANTO

c.p.c. ~~AL DIRIGENTE~~ ALLA DIREZIONE AMAT

Segreteria Generale

SEDI


DECISIONE DELLA G.M. RIUNITASI IL 22.12.1980

Oggetto: Delibera AMAT n. 384 del 26.11.1980 circa: presa atto
fatture n. 27/80 - Impresa A. De Bartolimeo - TA.

(Relatore Ass. Intelligente)

La G.M., nella seduta del 22.12.1980, PRENDE ATTO

N. 60/81 di Prot.



IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

Taranto, li 24.12.1980

COMUNE DI TARANTO



copia conforme
Taranto li 2 GEN 1981
FUNZIONARIO DELEGATO
(dr. Emilio ROMANDINI)

IL PRESIDENTE DELLA G.M.
[Signature]



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 11/Dicembre/80

N. di protocollo 2345/80 Rip.
Risposta a N. del
Allegati N.

Spett.le REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata
di Controllo sugli Atti degli
Enti Locali -
Via De Cesare, 102

RACCOMANDATA


TARANTO

Trasmettiamo oggetto delle deliberazioni adottate
dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda:

- Del. 384 del 26/11/80 : Presa atto fattura n.27/80 - Im
presa Angelo DE BARTOLOMEO -TA.
- " 397 " 3/12/80 : Presa atto fattura S.A.S.I.B. di
£. 6.437.751.= per acquisto mate
riali.
- " 398 " 3/12/80 : Presa atto fatture ditta PASTORE &
LOMBARDI di Bologna per complessi
ve £. 7.348.123.=
- " 399 " 3/12/80 : Liquidazione spese, diritti e ono
rario al dr. proc. Massimo Grimal
di. Causa AMAT/ALBANO Giovanni.
- " 400 " 3/12/80 : Integrazione deliberazione n.255
del 21/11/79 - Realizzazione conge
gni elettrici e manuali di sgancio
cancelli portone deposito officina
AMAT.
- " 403 " 3/12/80 : Presa atto computo metrico estima
tivo e relazione tecnica riguardan
ti i lavori occorrenti per la bitu
mazione del nuovo piazzale.

Distinti saluti.

FF/VM.-



Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)
[Signature]

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI
TARANTO

11/Dicembre/80

N. 2344/80 di Prot.

Al Sig. S I N D A C O
del Comune di Taranto

All'ASSESSORE ALLE MUNICIPALIZZATE
del Comune di Taranto

T A R A N T O

Completate alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n° 2(due) copie dei provvedimenti adottati dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda:

- Del. N° 384 = Presa atto fattura n. 27/80 - Impresa Angelo DE BARTOLOMEO - Taranto.
- " N° 397 = Presa atto fattura SASIB di £. 6.437.751= per acquisto materiali.
- " N° 398 = Presa atto fatture ditta PASTORE & LOMBAR DI di Bologna per complessive £.7.348.123=.
- " N° 399 = Liquidazione spese, diritti e onorario al Dr. Proc. Massimo GRIMALDI. causa AMAT/ALBANO Giovanni.
- " N° 400 = Integrazione deliberazione n. 255 del 21/11/79 - Realizzazione congegni elettrici e manuali di sgancio cancelli portone deposito officine AMAT.

Distinti saluti.

11 DIC 1980
(Vittorio CIPPONE)

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)

FF/VM.-

9209



COMUNE DI TARANTO
LAVORI PUBBLICI - EDILITA'

Taranto li, 4480

~~for~~ per Jennie Farn
per pulchra
9

055191


N..... Risp. N.....

Allegati n.

del

OGGETTO: Fattura ditta Angelo De Bartolomeo per lavori di demolizione e
rifacimento servizi igienici locali Via D'Aquino n. 40.

N. 6991/80 di Prot



All A.M.A.T.

T A R A N T O

Con riferimento alla nota n. 1791/80 del 24.9.1980 circa la richiesta di congruità sui prezzi fatturati dalla ditta Angelo De Bartolomeo per i lavori in oggetto si comunica che gli stessi, riferiti ai materiali forniti sono congrui, mentre per quanto riguarda la mano d'opera sembrano eccessivi, anche tenuto conto degli oneri assicurativi.

Le relative tabelle potranno essere fornite dall'Associazione Industriali.

Per quanto attiene al tempo di esecuzione dei lavori questo Ufficio, non avendo seguito i lavori stessi, non è in grado di convalidare quanto fatturato.

Si rileva infine che l'Impresa non ha maggiorato l'im-
porto dei lavori del 10% per spese generali, nè del 10% per
utile dell'Impresa.

LASSESSORE AI LL.PP.

Giovanni Battista

24/9/1980

Spett.le COMUNE DI TARANTO

Ufficio Tecnico

74100


TARANTO

N. 1791/80 di Prot.

Unitamente alla presente, Vi rimettiamo la fattura n. 27/80 e la relazione tecnica relative ai lavori di demolizione e rifacimento dei servizi igienici siti nei ns. locali di Via D'Aquino, con preghiera di voler esprimere parere di congruità sul prezzo richiesto.

In attesa di cortese riscontro porgiamo distinti saluti.-

AZIENDA MUNICIPALE AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO



ANGELO DE BARTOLOMEO
IMPRESA DI COSTRUZIONI



N. 5643/80 di Prot.

Taranto, 9/9/1980
Spett.le
A. M. A. T.
Via C. Battisti, 657
= T A R A N T O =

fugi
allegare
la pratica relazione
alle fotocopie e foggi
chiusa all'ufficio
tecnico del Comune
per la consegna del
prezzo

Oggetto: costruzione del gabinetto nei locali di via D'Aquino.

R E L A Z I O N E

E' stato eseguito un saggio per ricercare le cause del continuo intasamento dello scarico del gabinetto e non si è trovata traccia alcuna dell'esistenza di una tubazione di collegamento all'impianto fognante nel portone dell'edificio a fianco.

Richiesto ed ottenuto il consenso del proprietario del detto fabbricato, è stato aperto un varco dal portone ed attraverso la scala si è giunti al gabinetto del locale A.M.A.T.

Dall'ispezione, si è constatato che vi era un vecchio canale in muratura, completamente franato ed ostruito, sicchè acqua e liquami si disperdevano nelle fondazioni. Si spiegano così i numerosi ed infruttuosi interventi eseguiti in precedenza senza risultati.

Si è quindi proceduto alla costruzione della fogna mediante una tubazione di eternit Ø 200, collegata all'impianto fognante esistente nel fabbricato adiacente.

Contemporaneamente, sono stati eseguiti ex novo tutti gli scarichi interni, sostituiti ed incrementati gli apparecchi igienici secondo le esigenze prospettate dal personale, rifatta la pavimentazione ed il rivestimento.

E' stato anche rifatto l'impianto elettrico e posto un estrattore per eliminare i cattivi odori.

Infine sono state ripristinate le opere manomesse al fabbricato adiacente.

./.

LAVORI EDILI, STRADALI - IMPIANTI IDRICI, ELETTRICI E TERMICI - CIVILI E INDUSTRIALI

C.C.I.A.A. N. 20988

PARTITA I.V.A. 00346410731

CODICE FISC. DBR NGL 29B19 L049E

C.A.P. 74100 TARANTO - VIA MARGHERITA, 43 - TEL. 26328 - 22519

V. 293-9-80

ANGELO DE BARTOLOMEO
IMPRESA DI COSTRUZIONI

./.

Chiaramente si è trattato di lavoro eseguito completamente A MANO
ed in condizioni precarie essendosi i lavori svolti in spazi angusti.

Ditta DE BARTOLOMEO Angelo
Via Margherita n 43/A
74100 TARANTO


LAVORI EDILI, STRADALI - IMPIANTI IDRICI, ELETTRICI E TERMICI - CIVILI E INDUSTRIALI

C.C.I.A.A. N. 20988

PARTITA I.V.A. 00346410731

CODICE FISC. DBR NGL 29819 L049E

C. A. P. 74100 TARANTO - VIA MARGHERITA, 43 - TEL. 26328 - 22519

n° 1418 *g*ANGELO DE BARTOLOMEO
IMPRESA DI COSTRUZIONIN. *425/80* di Prot.*Rov*
g

Taranto, 9/9/1980

Spett/le

A.M.A.T.

Via C. Battisti, 657

= T A R A N T O =Fattura n. 27/80

«SCHEDA FORNITORE»

Oggetto: lavori di demolizione e rifacimento di servizi
igienici
nei Vs. locali in Via D'Aquino.Materiali in fornitura:

Cemento 325 q.li	7,00 x 5000	L.	35.000=
Vaso alla turca porcellanato		L.	28.000=
Lavabo Delta Mini		L.	12.000=
Orinatorio scala 1a		L.	36.500=
Tubo di piombo	Kg.23 x 1500	L.	34.500=
Tubo zingato	Kg.13 x 1500	L.	19.500=
Pozzetto di piombo Ø 120		L.	6.500=
Gomiti da 1/2, 3/8 n.10	n.10 x 400	L.	4.000=
Rubinetteria		L.	10.000=
Sifone a Bott. e piletta		L.	8.000=
Greis per pavimenti	mq. 4 x 6000	L.	24.000=
Piastrelle per rivestimento	mq.26 x 7000	L.	182.000=
Minuterie varie		L.	15.000=
Sommano in parziale		L.	415.000=
<u>Prestazioni di manod'opera comune e spec.</u>			
Operai n.2 dal 23/6 al 17/7 per un totale di giornate	gg.30 x £. 60.000 =	L.1.800.000=	
	Sommano in totale	L.2.215.000=	
I.V.A. al 15%		L. 332.250=	
		L.2.547.250=	
		=====	

NON LIQUIDARE*18/9/1980 g.*

LAVORI EDILI, STRADALI - IMPIANTI IDRICI, ELETTRICI E TERMICI - CIVILI E INDUSTRIALI

C.C.I.A.A. N. 20988


PARTITA I.V.A. 00346410731

CODICE FISC. DBR NGL 29B19 L049E

C. A. P. 74100 TARANTO - VIA MARGHERITA, 43 - TEL. 26328 - 22519

ANGELO DE BARTOLOMEO
IMPRESA DI COSTRUZIONI

fgr
allegare la presente relazione alle fatture e pagare anche all'ufficio tecnico del Comune per la congruità dei prezzi



N. 5643/80 di Prot.

Taranto, 9/9/1980
Spett/le
A. M. A. T.
Via C. Battisti, 657
= T A R A N T O =

Oggetto: costruzione del gabinetto nei locali di via D'Aquino.

R E L A Z I O N E

E' stato eseguito un saggio per ricercare le cause del continuo intasamento dello scarico del gabinetto e non si è trovata traccia alcuna dell'esistenza di una tubazione di collegamento all'impianto fognante nel portone dell'edificio a fianco.

Richiesto ed ottenuto il consenso del proprietario del detto fabbricato, è stato aperto un varco dal portone ed attraverso la scala si è giunti al gabinetto del locale A.M.A.T.

Dall'ispezione, si è constatato che vi era un vecchio canale in muratura, completamente franato ed ostruito, sicchè acqua e liquami si disperdevano nelle fondazioni. Si spiegano così i numerosi ed infruttuosi interventi eseguiti in precedenza senza risultati.

Si è quindi proceduto alla costruzione della fogna mediante una tubazione di eternit Ø 200, collegata all'impianto fognante esistente nel fabbricato adiacente.

Contemporaneamente, sono stati eseguiti ex novo tutti gli scarichi interni, sostituiti ed incrementati gli apparecchi igienici secondo le esigenze prospettate dal personale, rifatta la pavimentazione ed il rivestimento.

E' stato anche rifatto l'impianto elettrico e posto un estrattore per eliminare i cattivi odori.

Infine sono state ripristinate le opere manomesse al fabbricato adiacente.

./.

V. 93-9-80

ANGELO DE BARTOLOMEO
IMPRESA DI COSTRUZIONI

./.

Chiaramente si è trattato di lavoro eseguito completamente **A MANO**
ed in condizioni precarie essendosi i lavori svolti in spazi angusti.

Ditta DE BARTOLOMEO Angelo
Via Margherita n. 43/A
74100 TARANTO

LAVORI EDILI, STRADALI - IMPIANTI IDRICI, ELETTRICI E TERMICI - CIVILI E INDUSTRIALI

C.C.I.A.A. N. 20988

PARTITA I.V.A. 00346410731

CODICE FISC. DBR NGL 29B19 L049E

C. A. P. 74100 TARANTO - VIA MARGHERITA, 43 - TEL. 26328 - 22519
